

Slovensko 3.0

(Zápis zo zasadnutia riadiaceho výboru)

Účastníci

Vedúci stretnutia:	Roman Miškovič				
Účel stretnutia:	Zasadnutie Riadiaceho výboru programu Slovensko 3.0			Trvanie	90 min.
Miesto stretnutia:	Zasadacia miestnosť Hont 23.31	Dátum	16.01.2025	Čas	10:00
Meno a Priezvisko:	Pozícia v programe:			OVM	
Prítomní s hlasovacím právom:					
Juraj Paxián	Poverený na zastupovanie poverujúceho Predsedu RV			MIRRI SR	
Andrej Peterka	Podpredseda RV			MIRRI SR	
Ľubomír Mindek	Zástupca NASES			NASES	
Michal Špánik	Zástupca stratégie ITVS			MIRRI SR	
Ľudovít Holbík	Zástupca NASES za prevádzku			NASES	
Prítomní bez hlasovacieho práva:					
Roman Miškovič	Programový manažér Slovensko 3.0			MIRRI SR	
Daniela Mesková	Zástupca produktového portfólia			MIRRI SR	
Michal Ilko	Zástupca SDA			MIRRI SR	
Juraj Hupka	Zástupca NASES za riadenie projektov			NASES	
Martina Hasayová	Zástupca implementácie Plánu obnovy a odolnosti			MIRRI SR	
Jozef Toman	Zástupca projektového portfólia MIRRI			MIRRI SR	
Alba María Hernández	Tajomník RV			MIRRI SR	
Roman Bíro	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI SR	
Ivan Vyhlídal	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI SR	
Lukáš Zendulka	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI SR	
Samuel Esterka	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NASES	
Andrej Krátky	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NASES	
Karol Flak	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NASES	
Martin Holly	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NASES	
Jozef Koža	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NASES	
Klára Cigániková	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI SR	
Martina Hilčíková	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI SR	
Tereza Málková	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NIKA	
Patrik Kováč	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NIKA	
Neprítomní (pozvaní):					

Agenda

1. Zloženie Riadiaceho výboru
2. Prehľad portfólia Platformy
3. Riadenie portfólia a programov
4. Prehľad aktivít projektov MIRRI a NASES
5. Odpočet projektov
6. Infraštruktúrne možnosti nasadenia komponentov
7. Riziká
8. Rozhodnutia/Úlohy

Priebeh zasadnutia

- V úvode stretnutia programový manažér Roman Miškovič informoval členov o priebehu tretieho zasadnutia Riadiaceho výboru Programu Slovensko 3.0. Cieľom zasadnutia je informovať o stave Platformy a jej komponentov, o novom modeli riadenia programov pod Platformou, ktoré zoskupujú vecne súvisiace projekty a o pláne verejných obstarávaní jednotlivých projektov s dôrazom na potrebné kroky pre naplnenia míľnika 1 POO.
- Na zasadnutí sú prítomní 4 členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom. Predsedu zastupuje z dôvodu jeho iných pracovných povinností p. Juraj Paxián na základe poverenia. Riadiaci výbor je uznášaniaschopný.
- Tohto zasadnutia sa zúčastňujú dvaja zástupcovia NIKA.

1. Zloženie RV

- Predseda menoval na funkciu Zástupcu SITVS p. Michala Špánika, ktorý je novým GRS SITVS.
- Navrhlo sa pridanie 3 funkcií medzi členov Riadiaceho výboru bez hlasovacieho práva:
 - 1) Zástupca NASES za projektové riadenie: Juraj Hupka,
 - 2) Zástupca SDA: Michal Il'ko,
 - 3) Zástupca projektového portfólia MIRRI: Jozef Toman.
 - tieto zmeny boli odsúhlasené a na základe toho bude Tajomníčka dodatočne Štatút

2. Prehľad portfólia Platformy

- Prítomným bolo odprezentované portfólio projektov Platformy pre Životné situácie. Projekty boli odprezentované na základe rozdelenia podľa čiastkových cieľov, ktoré napĺňajú a tými sú:
 - a) prerekvizity (CAMP a mÚPVS),
 - b) MMP Platformy (splnenie míľnika POO - kritická cesta),
 - c) ďalší rozvoj Platformy,
 - d) požiadavky mimo POO.
 - rozdelenie projektov podľa jednotlivých cieľov je zobrazené na str. 4 prezentácie v prílohe
 - termín pre naplnenie míľnika 1 POO je Q4 2024 (posun 06/2025)

3. Riadenie portfólia a programov

- Nastala zmena pri forme manažérskeho riadenia Platformy pre životné situácie za účelom vytvorenia viacúrovňového systému. Riadenie Platformy pozostáva z 2 portfólií a to „Rozvoj Centrálnych komponentov“ a „Optimalizácia prevádzkovej platformy“.

- Portfólio „Rozvoj Centrálnych komponentov“ sa člení na 5 programov, ktoré zoskupujú navzájom vecne súvisiace projekty.
- Portfólio „Optimalizácia prevádzkovej platformy“ sa člení na 2 programy, je celé zamerané na backend a je celé v gescii NASES.
- Riadenie Platformy a presné začlenenie projektov do programov je ilustrované na str. 5 prezentácie v prílohe. Je tam uvedené aj obsadenie jednotlivých manažérskych rolí.
- Platforma je manažérsky aj vecne riadená spoločne MIRRI a NASES.

4. Prehľad aktivít projektov MIRRI a NASES

- Plán verejných obstarávaní projektov v Platforme je zobrazený na str. 8 prezentácie v prílohe. Jednotlivé verejné obstarávania sú rozdelené podľa projektov, nositeľa (MIRRI/NASES) a čiastkových cieľov.
- Zmluvný rámec pre plnenie cieľov máme pri 3 komponentoch, ostatné VO sú v príprave a budú v blízkej dobe vyhlásené.
- V prezentácii sú vyznačené rizikové termíny.

5. Odpočet projektov

- Informácie k jednotlivým projektom v programoch Platformy sú uvedené na str. 10 – 15 prezentácie v prílohe. Boli odprezentované podľa programov pomenovaných na základe vecného prepojenia projektov.

6. Infraštruktúrne možnosti nasadenia komponentov

- Portfólio „Optimalizácia prevádzkovej platformy“ je čisto backendové a celé je v gescii NASES. NASES chce Slovensko 3.0 využiť aj na to, aby prevádzka nebola úplne outsourcovaná. Cieľom je, aby sa zvýšila prevádzková bezpečnosť a znížila závislosť štátu na konkrétnych dodávateľoch.
- Dočasná platforma má podporu ešte 3 roky, ale nie je to cieľová platforma. Do Q1 26 je už ambícia využívať finálnu platformu.

7. Riziká

- CAMP - predlžovanie procesu obstarania rozvojových požiadaviek pre zabezpečenie napájania OVM v ŽS
- CPDI (CSRÚ) - oneskorenie pri realizácii dátových integrácií pre OVM na ŽS, absencia zmluvného rámca pre implementáciu
- KAV 2.0 - identifikovaná potreba zahrnutia rozvojovej požiadavky v projekte CPDI

8. Diskusia

- ŽoP na EK odchádzajú podľa termínov. Termín pre 6. ŽoP je 30.06.2025 – to, čo k danému dátumu bude, to sa odošle v krajnom prípade ako nekompletná ŽoP s tým, že v čase hodnotenia implementácia dobehne a v nejakom čase Platforma splní parametre míľnika.
- Z pohľadu NIKA k úplnej implementácii Platformy v Q2 2025 nesmerujeme.
- Komisia hodnotí 2 mesiace plnenie míľnika (prešiel/neprešiel). Ak sa im zdá, že míľnik ani po 2 mesiacoch nie je splnený, vyzve členský štát o doplnenie/vysvetlenie a pri nesplnení míľnika bude sankcia zadržania približne 30 mil. €, ale suma nebude nenávratne odobratá. Potom bude udelená ešte šesťmesačná nápravná lehota a až po nesplnení nápravnej lehoty nám odoberú alokáciu nenávratne.
- Z nariadenia vyplýva, že všetky prostriedky musia byť vyplatené do konca 2026.

Rozhodnutia

Číslo R.	Navrhované rozhodnutia	Schválené
R_13/RV_03/2025	RV schvaľuje pridanie nových členov do Riadiaceho výboru	ÁNO
R_14/RV_03/2025	RV schvaľuje prechod z prípravnej a inicializačnej fázy do realizačnej fázy projektu OOTS	ÁNO
R_15/RV_03/2025	RV berie na vedomie , že verejné obstarávania vyhlásené do 16.1.2025 sú v súlade s cieľmi Platformy	ÁNO
R_16/RV_03/2025	RV berie na vedomie plán verejných obstarávaní pre plnenie cieľov Platformy	ÁNO

Úlohy

Č.	Úloha	Termín	Zodpovedný	Plnenie /status
U_10/RV_03/2025	RV ukladá projektom povinnosť pri predkladaní dokumentácie k schváleniu VO na RV dodať súčasne plán realizácie projektu s garanciou realizovateľnosti v rámci oprávneného obdobia POO	Priebežne	Projekty	NOVÁ
U_11/RV_03/2025	RV ukladá úlohu pripraviť plán sprístupnenia centrálneho komponentu pre OVM implementujúce životné situácie	14.02.2025	Projekt DLK	NOVÁ
U_12/RV_03/2025	RV ukladá úlohu dodať harmonogram implementácie zmenových požiadaviek na súčasné komponenty	31.01.2025	NASES	NOVÁ
U_13/RV_03/2025	RV ukladá úlohu dodať harmonogram optimalizácie prevádzkovej infraštruktúry a zabezpečiť priebežné odpočtovanie stavu na programovej úrovni	31.01.2025	NASES	NOVÁ
U_14/RV_03/2025	RV ukladá zadať štruktúru súhrnného dokumentu a návrh dôkazov k preukázaniu implementácie Platformy	15.02.2025	Roman Miškovič	NOVÁ
U_15/RV_03/2025	RV ukladá úlohu vecne zdôvodniť a popísať navrhované nahradenie funkcionality AFPM (release 1 CPK) novou funkcionalitou mobilného podpisovania v prostredí súčasného ÚPVS, realizovaného zo strany NASES ako samostatnú časť mimo projektu CPK s tým, že projekt CPK dodá funkcionality v zmysle aktualizovaných harmonogramov a Release 1 nebude súčasťou MMP Platformy určenej pre odpočet míľnika. Súčasťou odôvodnenia bude aj roadmapa dodávaných funkcionalít.	31.1.2025	Daniela Mesková/Juraj Hupka/ Projekt CPK	NOVÁ

U_16/RV_03/2025	RV ukladá projektu CAMP vyriešiť rozvojový rámec na 2025	31.01.2025	NASES v súčinnosti MIRRI	NOVÁ
U_17/RV_03/2025	RV ukladá projektu KAV vyriešiť rozvojový rámec na 2025	31.01.2025	MIRRI	NOVÁ
U_18/RV_03/2025	RV ukladá projektu CSRÚ vypracovať prístup k zabezpečeniu realizačného rámca (minimálne konštrukt toho, ako budeme pristupovať k zabezpečeniu integrácií / spôsob, ako sa zabezpečí rozbeh integrácií v marci 2025)	31.01.2025	MIRRI	NOVÁ

Semaforový status:	
NOVÁ/PREBIEHA – plnenie načas a bez problémov	NOVÁ
PREBIEHA – plnenie ohrozuje prekážky	PREBIEHA
POZASTAVENÁ/NESPLNENÁ – nedodržanie termínu plnenia	NESPLNENÁ

Schválenie

Zápis zo stretnutia bol zaslaný všetkým zúčastneným a vymenovaným zástupcom. Pripomienky a návrhy k tomuto zápisu treba vzniesť do **27.01.2025**, po tomto termíne bude tento zápis považovaný za schválený.

Meno	Pripomienka

Finálny zápis zo zasadnutia Riadiaceho výboru podľa článku 7 bodu 3 štatútu Riadiaceho výboru programu **Slovensko 3.0** podpisuje a schvaľuje **predseda Riadiaceho výboru**.

Meno a Priezvisko	Podpis predsedu
Ing. Ivan Ivančín Štátny tajomník II.	



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PLATFORMA PRE ŽIVOTNÉ SITUÁCIE I1, K17, POO

Riadiaci výbor 16.1.2025

(DIGITÁLNE SLOVENSKO - štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)

16.1.2025



Agenda

1. Zloženie Riadiaceho výboru
2. Prehľad portfólia Platformy
3. Riadenie portfólia a programov
4. Prehľad aktivít projektov MIRRI a NASES
5. Odpočet projektov
6. Infraštruktúrne možnosti nasadenia komponentov
7. Riziká
8. Rozhodnutia/Úlohy

Platforma pre životné situácie: Zloženie Riadiaceho výboru

Člen RV	Nominácia	Hlasovacie právo
Predseda RV – Štátny tajomník II	Ing. Ivan Ivančin	ÁNO
Podpredseda riadiaceho výboru	Ing. Andrej Peterka	ÁNO
Zástupca NASES	Ing. Ľubomír Mindek	ÁNO
Zástupca stratégie ITVS	JUDr. Michal Špánik	ÁNO
Zástupca NASES za prevádzku	Ing. Ľudovít Holbík	ÁNO
Zástupca produktového portfólia	Mgr. Daniela Mesková	NIE
Zástupca SDA	Ing. Michal Il'ko	NIE
Zástupca NASES za riadenie projektov	Ing. Juraj Hupka	NIE
Zástupca IT architektúry	n/a	NIE
Zástupca dodávateľa	n/a	NIE
Zástupca portfólio manažmentu a programového manažmentu MIRRI	Mgr. Roman Miškovič	NIE
Zástupca implementácie Plánu obnovy a odolnosti	Ing. Martina Hasayová, PhD.	NIE
Programový manažér SVK 3.0	Mgr. Roman Miškovič	NIE
Programový manažér ŽS	Mgr. Roman Miškovič	NIE
Tajomník RV	Ing. Alba María Hernández	NIE
Zástupca projektového portfólia MIRRI	Ing. Jozef Toman	NIE

Zmena u členov s hlasovacím právom – nové obsadenie funkcie Zástupca stratégie ITVS: JUDr. Michal Špánik

Zmena u členov bez hlasovacieho práva – nová funkcia Zástupca SDA: Ing. Michal Il'ko

– nová funkcia Zástupca NASES za riadenie projektov: Ing. Juraj Hupka

– nová funkcia Zástupca projektového portfólia MIRRI: Ing. Jozef Toman


Predmetom hlasovania je zaradenie dvoch nových funkcií bez hlasovacieho práva do Riadiaceho výboru (v prípade odsúhlasenia bude Tajomníčka dodatočne štatút v zmysle odsúhlasenej zmeny)

Platforma pre životné situácie: Portfólio produktov

- Portfólio projektov Platformy pre Životné situácie
- Kritická cesta pre naplnenie míľnika POO

ČIASTKOVÉ CIELE	VO / ZMLUVA	KOMPONENT
PREREKVIZITY	MIRRI	CAMP
	NASES	mÚPVS
MMP PLATFORMY (splnenie míľnika POO)	MIRRI	Interaktívny sprievodca
	MIRRI	CPK
	MIRRI	KAV 2.0 Monitoring
	NASES	CNM
		eFORM Dizajnér
ĎALŠÍ ROZVOJ PLATFORMY	NASES	Konštruktor správ
		Lokátor služieb
	NASES	CZU
		COP
	NASES	IAM 3.0
	NASES	PAP 2.0
	NASES	eDESK 3.0
	NASES	CEP
	MIRRI	SvM
	MIRRI	Digitálny onboarding
	MIRRI	OOTS
	MIRRI	CSRÚ - rozvoj
POŽIADAVKY MIMO POO	NASES	ÚPVS
	MIRRI	

Platforma pre životné situácie: Riadenie portfólia a programov

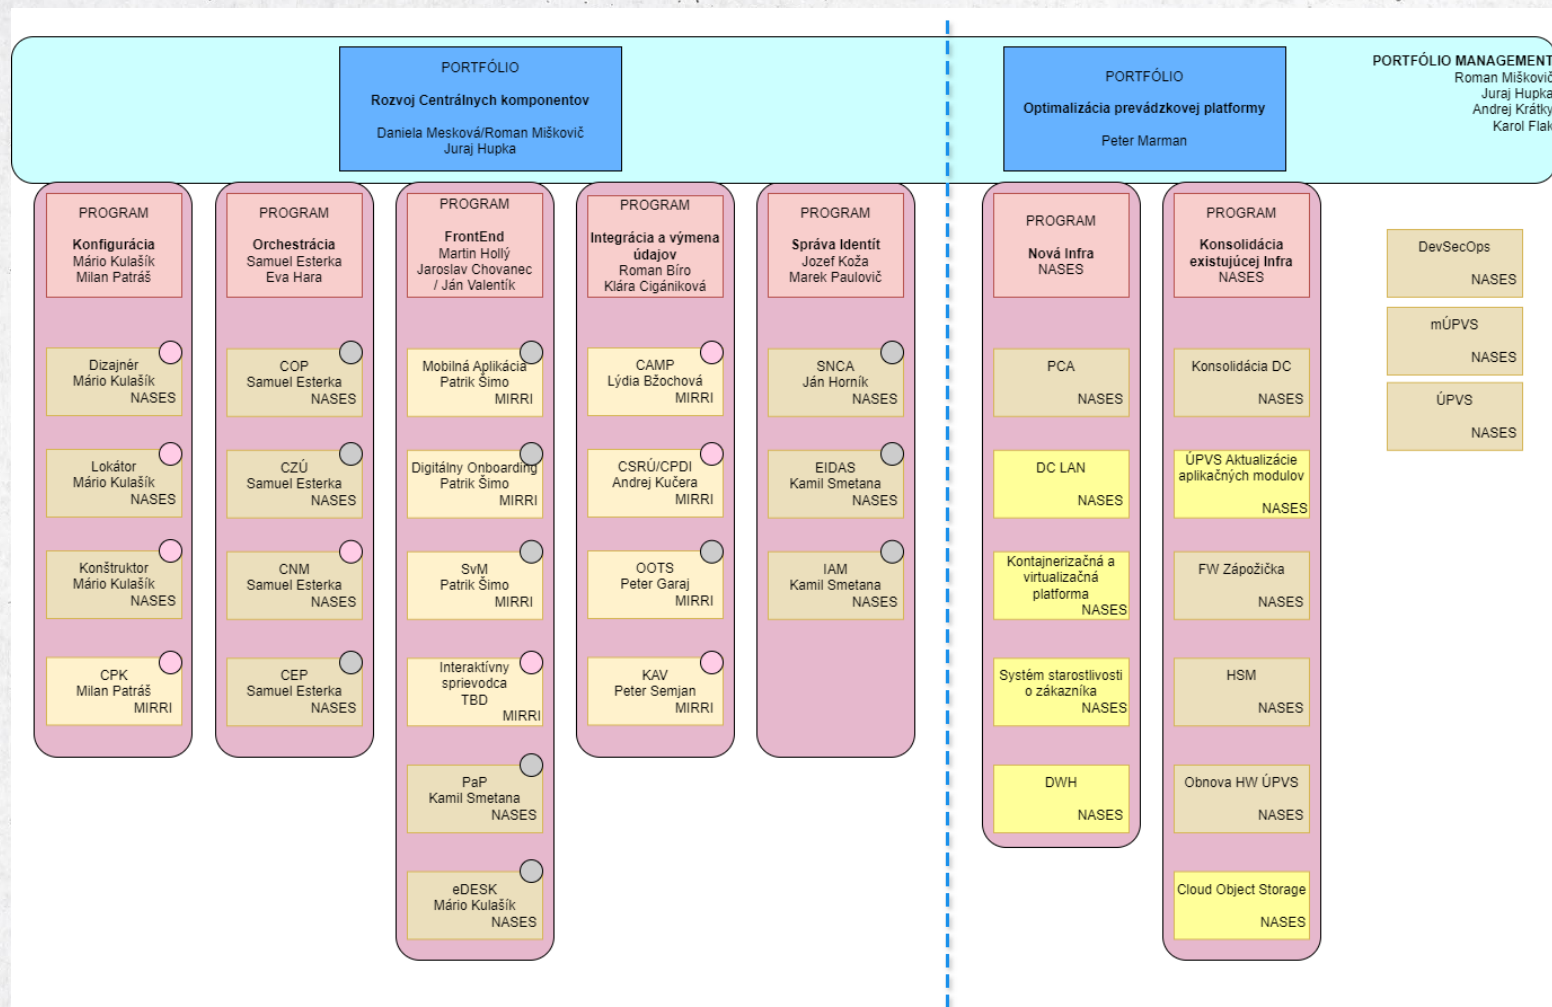



Platforma pre životné situácie: Biznisový prínos

1. Platforma pre ŽS - prínos pre občana - vykazujeme projektami na Kritickej ceste (MMP) - Q4/2024 - plní míľnik I1 POO
2. Optimalizácia a modernizácia platformy – plnenie Q1/2026

Platforma pre životné situácie: Východiská

Míľnik 1 POO – Platforma- Preukázanie naplnenia (úplná implementácia platformy)

- 12/2024 – termín míľnika – posun 06/2025 – odpočet v súhrnnom dokumente (SD) na EK
- 09/2025 – 6.ŽoP na EK

Príprava SD už začína teraz – potrebné definovať:

1. Súhrn uskutočnených zmien – KRITICKÁ CESTA + identifikovať ďalší rozvoj
 2. Dokument o uvedení do prevádzky
- Začať komunikáciu so zástupcom EK (koniec 02/2025)

Plán VO projektov v Platforme

ČIASTKOVÉ CIELE	NOSITEĽ	VO/ZMLUVA	Q3 / 2024	Q4 / 2024	Q1 / 2025	Q2 / 2025	Q3 / 2025	Q4 / 2025	Q1 / 2026
PREREKvizITY	MIRRI	CAMP - Rozvoj 2025			V Z		R1		
	NASES	CAMP - Rozvoj 2026+				V	Z		R1
	NASES	mÚPVS							
MMP PLATFORMY (splnenie mlfnika POO)	MIRRI	Interaktívny sprievodca			V Z		R1		
	MIRRI	CPK			V		Z	R1	R2
	MIRRI	KAV 2.0 - Rozvoj 2025			V Z		R1		
	MIRRI	KAV 2.0 - Rozvoj 2026+				V		Z	R1
	MIRRI	CSRÚ - integrácie			Z	R1	R2	R3	R4
	NASES	CNM		V	Z	R1			R2
		eFORM dizajnér							
ĎALŠÍ ROZVOJ PLATFORMY	NASES	Konštruktor správ		V		Z	R1		R2
		Lokátor služieb							
	NASES	CZU			V		Z		R1
		COP							R2
	NASES	IAM 3.0			Z				R1
	NASES	PAP 2.0				V	Z		R1
	NASES	eDESK 3.0			V Z				R1
	NASES	CEP		V	Z				R1
	MIRRI	SvM - Rozvoj 2025			V Z		R1		
	MIRRI	SvM - Rozvoj 2026+				V		Z	R1
	MIRRI	Digitálny onboarding				V		Z	R1
	MIRRI	Mobilná aplikácia				V			R1
	MIRRI	OOTS			Z				R1
	MIRRI	CSRÚ - rozvoj							
POŽIADAVKY MIMO POO	NASES	ÚPVS			Z	R1	R2	R3	R4
	MIRRI								



Informácie k jednotlivým projektom v programoch Platformy pre životné situácie

Program KONFIGURÁCIA

CPK – Centrálny podpisový komponent

- VO v procese PHZ – oneskorenie - aktualizácia harmonogramu s dopadom na dodanie AFPM
- AFPM – návrh na vyradenie z kritickej cesty vzhľadom na aktualizovaný harmonogram
- **Časový posun vo VO CPK má dopad na harmonogram projektu/programu a hrozí nedodanie požadovanej funkcionality v mílniku Q3/2025 v rámci POO**

DLK – Dizajnér, Lokátor, Konštruktör

- VO prebieha v 2 kolách - **RIZIKO**
- VO v 1. kole užšej súťaže (1mesiac sklz) predpoklad ukončenia VO a uzavretia Zmluvy je 7.3.2025
- **Časový posun vo VO DLK má dopad na harmonogram projektu/programu a hrozí nedodanie nasadeného dizajnéra formulárov v mílniku Q1/2025 v rámci POO**

Program FRONT END

EDesk3.0 – Elektronická schránka

- Vyhlásenie VO (PRK) - 22.1.2025

PAP2.0 - Portfólio a profil klienta 2.0

- Prebieha príprava podkladov k VO (PTK/PHZ)
- Vyhlásenie VO - 3.2.2025

IS – Interaktívny Sprievodca

- Prebieha proces prípravy podkladov k VO (PTK/PHZ)
- Vyhlásenie VO 19.2.2025- priama zákazka do 50 000 na súčasného dodávateľa (MVP verzia)
 - Malý rozvoj + podpora

MAM – Mobilná Aplikácia MIRRI

- Prebieha proces prípravy VO (príprava zmluvy, príprava SLA, vypracovanie OPZ, interné pripomienkovanie)
- Vyhlásenie VO - 18.3.2025

DO – Digitálny onboarding

- Prebieha proces prípravy VO (projektový zámer, prístup k projektu, katalóg požiadaviek, BC/CBA, OPZ, zmluva, SLA, ideový zámer)
- Vyhlásenie VO 5.5.2025

SVM – Slovensko v Mobile

- Prebieha proces prípravy VO (projektový zámer, prístup k projektu, katalóg požiadaviek, BC/CBA, OPZ, zmluva, SLA)
- Vyhlásenie VO 3.3.2025



Program ORCHESTRÁCIA

CNM – Centrálny notifikačný modul

- Podpísanie ZoD - 17.1.2025 (začiatok dodávky)
- R1 – kritická cesta dodávka do 31.3.2025

CEP – Centrálna elektronická podateľňa 2.0

- Prebieha VO, doručenie ponúk do 21.1.2025
- Podpísanie ZoD do 15.2.2025

COP/CZU – Centrálna orchestračná platforma / Centrálna zbernica udalostí

- Vyhlásenie VO 23.1.2025

Všetky termíny dodávok sú potvrdené do Q1/2026

- kritická cesta je R1 CNM, ktoré bude dodané do 31.3.2025 v súlade s plánom



Program INTEGRÁCIA A VÝMENA ÚDAJOV

OOTS – Once-Only Technical System

- Schválenie prechodu z inicializačnej fázy do realizačnej fázy

CAMP – Centrálna API manažment platforma

- Zrýchlenie procesu VO pre Malý Rozvoj 2025 - **kritické pre ŽS a míľnik**
- Príprava podkladov k VO pre CAMP 2.0

KAV – Konsolidovaná analytická vrstva

- Malá SLA bude realizovaná podlimitnou zákazkou
- Potrebná súčinnosť s CPDI – zkomponovanie biznis požiadaviek do rozvojového rámca CPDI

CPDI (CSRÚ) – Centrálna správa referenčných údajov

- Chýba zmluvný základ pre realizáciu dátových integrácií - **Kritické pre ŽS a míľniky**

Program **SPRÁVA IDENTÍT**

SNCA – Kvalifikovaná dôveryhodná služba

- Prebieha VO od 6.1.2025 do 13.3.2025

IAM3.0 – Identity and Access management

- Riziko vykonateľnosti technickej implementácie v období oprávnenosti POO

eIDAS3 – Stotožňovanie cudzincov

- Súčinnosť zo strany MV SR a dodávky služieb RFO má oneskorenie viac ako rok a aktuálne testovanie nebude ukončené v januári 2025, fáza NaPIP je tretíkrát predĺžená do 31.03.2025 a podľa všetkého to nebude stačiť (výhľad 06.25)
- Prebieha nasadzovanie do UAT a bugfixing



Portfólio Optimalizácia prevádzkovej platformy

Nová infraštruktúra

- Pred spustením VO novej Kontajnerizačnej a virtualizačnej platformy

Konsolidácia existujúcej infraštruktúry

- Prebieha obnova HW

DevSecOps procesy

- Pripravuje sa PCA platforma
- Pripravuje sa GitLab
- Definujú sa procesy

Program Slovensko 3.0: Riziká/Issues

- **IAM3.0**

- má byť dodaný v termíne 03.26, čo znamená potrebu integrovať všetky komponenty doručené pred týmto termínom na súčasný IAM a neskôr spraviť migráciu na IAM3.0 - implementácia zmien aj na súčasný IAM

- **DLK**

- nedostupnosť infraštruktúrneho prostredia do ukončenia VO na dielo DLK resp. plnohodnotného prostredia pre nasadenie R1 do 02-03/2025 v zmysle termín/míľniku POO/OPZ/Zmluvy
- Riziko oneskorenia sprístupnenia riešenia eFormulárov pre OVM na ŽS
- Lokátor a konštruktor - plán ukončenia v potrebnom časovom termíne, aby bolo možné zabezpečiť následnú implementáciu komponentov DLK v termíne ukončenia POO

- **CPK**

- posun harmonogramu
- zabezpečenie súčinnosti dodávateľov, ktoré môže viesť ku komplikáciám s realizáciou CR na súčasné centrálné komponenty, bez ktorých nevieme realizovať nasadenie riešenia v jednotlivých releasoch v požadovaných termínoch

Riziká/Identifikované problémy

- **CAMP**

- predlžovanie procesu obstaranie rozvojových požiadaviek pre zabezpečenie napájania OVM v ŽS

- **CPDI (CSRÚ)**

- Oneskorenie pri realizácii dátových integrácií pre OVM na ŽS, absencia zmluvného rámca pre implementáciu

- **KAV 2.0**

- identifikovaná potreba zahrnutia rozvojovej požiadavky v projekte CPDI

Navrhované rozhodnutia RV

Navrhované rozhodnutie RV	Hlasovanie
RV schvaľuje prechod z prípravnej a inicializačnej fázy do realizačnej fázy projektu OOTS	
RV berie na vedomie, že VO vyhlásené do 16.1.2025 sú v súlade s cieľmi Platformy	
RV berie na vedomie plán VO pre plnenie cieľov Platformy	

Úlohy z RV

Úlohy	Zodpovedný/Termín
RV ukladá projektom povinnosť pri predkladaní dokumentácie k schváleniu VO na RV dodať súčasne plán realizácie projektu s garanciou realizovateľnosti v rámci oprávneného obdobia POO	Projekty/priebežne
RV ukladá úlohu pripraviť plán sprístupnenia centrálného komponentu pre OVM implementujúce životné situácie	Projekt DLK/ 14.2.2025
RV ukladá úlohu dodať harmonogram implementácie zmenových požiadaviek na súčasné komponenty	NASES/31.1.2025
RV ukladá úlohu dodať harmonogram optimalizácie prevádzkovej infraštruktúry a zabezpečiť priebežné odpočtovanie stavu na programovej úrovni	NASES/31.1.2025
RV ukladá zadať štruktúru súhrnného dokumentu a návrh dôkazov k preukázaniu implementácie Platformy	Roman Miškovič/ 15.2.2025



PLÁN [OBNOVY]

cestovná
mapa k lepšiemu
Slovensku
