

Slovensko 3.0

(Zápis zo zasadnutia riadiaceho výboru)

Účastníci

Vedúci stretnutia:	Roman Miškovič				
Účel stretnutia:	Zasadnutie Riadiaceho výboru programu Slovensko 3.0			Trvanie	60 min.
Miesto stretnutia:	Zasadacia miestnosť Hont 23.31	Dátum	17.10.2024	Čas	11:00
Meno a Priezvisko:	Pozícia v programe:			OVM	Ospravedlnený A/N
Prítomní s hlasovacím právom:					
Andrej Peterka	Podpredseda RV			MIRRI	
Ľubomír Mindek	Zástupca NASES			NASES	
Martin Déneši	Zástupca stratégie ITVS			MIRRI	
Ľudovít Holbík	Zástupca NASES za prevádzku			NASES	
Prítomní bez hlasovacieho práva:					
Roman Miškovič	Programový manažér Slovensko 3.0			MIRRI	
Daniela Mesková	Zástupca produktového portfólia			MIRRI	
Martina Hasayová	Zástupca implementácie Plánu obnovy a odolnosti			MIRRI	
Alba María Hernández	Tajomník RV			MIRRI	
Peter Garaj	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Peter Semjan	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Andrej Kučera	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Patrik Šimo	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Ľubomír Gabaj	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Tomáš Minár	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Klára Cigániková	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Vladimír Raučina	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Vladimír Kováč	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Roman Bíro	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Jozef Toman	Prizvaný člen na zasadnutie RV			MIRRI	
Juraj Hupka	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NASES	
Maroš Mikluš	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NASES	
Samuel Esterka	Prizvaný člen na zasadnutie RV			NASES	
Neprítomní (pozvaní):					
Ivan Ivančin	Predseda RV			MIRRI	A

Agenda

1. Zloženie RV
2. Prehľad portfólia programu
3. Prehľad aktivít projektov MIRRI a NASES
4. Odpočet projektov - mÚPVS, CAMP, SvM, KAV
5. Infraštruktúrne možnosti nasadenia komponentov
6. Riziká / otvorené body

Priebeh zasadnutia

- V úvode stretnutia programový manažér Roman Miškovič informoval členov o priebehu druhého zasadnutia Riadiaceho výboru Programu Slovensko 3.0. Cieľom zasadnutia je informovať o stave Programu a jeho komponentov.
- Na zasadnutí sú prítomní 4 členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom. Predseda Riadiaceho výboru je neprítomný a je ospravedlnený z dôvodu iných pracovných povinností. Riadiaci výbor je uznášaniaschopný.

1. Zloženie RV

Úloha z minulého zasadnutia, ktorá ukladala zapracovať schválené zmeny Štatútu a pripraviť menovacie dekréty pre novovzniknuté role vychádzajúce zo zmien Štatútu bola splnená. Noví navrhnutí členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom už boli Predsedom menovaní. Na tomto zasadnutí malo prebehnúť menovanie 3 členov Riadiaceho výboru bez hlasovacieho práva, ale z dôvodu neprítomnosti Predsedu, ktorý na základe Štatútu ako jediný členov menuje, sa toto odkladá na inokedy.

2. Prehľad portfólia programu

○ Zaradenie KAV 2.0 do scope programu

IS KAV je platforma obsahujúca súbor funkcionalít pripravených na nasadenie pre konkrétne OVM a príslušnú analytickú jednotku. V rámci projektu KAV bol pripravený tento samostatný informačný systém a zároveň jeho nasadenie do prostredia MIRRI na modernej cloud technológii. V tejto inštancii KAV-MIRRI boli zároveň pripravené dátové štruktúry, ETL procesy, logické databázové modely a vizualizačné self-serve BI nástroje a dashboards podľa potrieb jednotlivých OVM a Životných situácií. KAV 2.0 ako dátová platforma bude primárne zameraná v prvej fáze na zabezpečenie monitoringu 16 prioritných Životných situácií a zberu spätnej väzby od občanov, vrátane analytických dát z Google Analytics z jednotlivých štátnych webov. Od marca 2024 priebežne prebiehajú diskusie a workshopy s jednotlivými príslušnými OVM, ktoré vstupujú do monitoringu Životných situácií.

Ideový zámer bol schválený Produktovou, Architektonickou a Projektovou komisiou. Momentálne sa pripravujú podklady na vysúťaženie SLA partnera ako aj potrebná dokumentácia k vyhláseniu VO na strategického partnera.

Na základe preukázaného súvisu so Životnými situáciami sa odporúča zaradiť riadenie KAV 2.0 pod Program Slovensko 3.0.

○ Zaradenie OOTS do scope programu

Na príprave predmetnej analýzy participovali Oddelenie dátovej kancelárie, Oddelenia digitálneho ekosystému a Oddelenia manažmentu životných situácií. Výsledkom je, že 23 dôkazov z Nariadenia o SDG sa týka 1 životnej situácie, 10 dôkazov z Nariadenia o SDG sa týka 2 životných situácií, 6 dôkazov z Nariadenia o SDG sa týka 3 životných situácií, 1 dôkaz z Nariadenia o SDG sa týka až 4 životných situácií a ďalší 1 dôkaz z Nariadenia o SDG sa týka až 5 životných situácií. Z celkového počtu 55 dôkazov z Nariadenia o SDG má 41 dôkazov prienik so Životnými situáciami a 14 dôkazov z Nariadenia o SDG zatiaľ nemá prienik so žiadnou životnou situáciou.

Na základe prieniku so Životnými situáciami sa odporúča zaradiť riadenie OOTS pod Program Slovensko 3.0.

○ Vyradenie MOU a EUDIW zo scope Programu

V zmysle novely zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch prešla agenda digitalizácie dokladov pod gesciu MV SR. Ako výsledok bol začatý proces delimitácie príslušnej agendy ako aj IS MOU. Ponechanie EUDIW v scope Programu by predstavovalo riziko potenciálnej duplicity vývoja riešení v oblasti digitálnych dokladov.

Nakoľko MOU a EUDIW neboli zaradené na kritickú cestu a ich nedodanie neohrozuje plnenie míľnikov pre Platformu a Životné situácie, navrhuje sa vyradenie MOU a EUDIW zo scope Programu.

○ Vyradenie Remote signing zo scope CPK

Pri Remote Signing procese ide o autorizáciu kvalifikovaného elektronického podpisu, a teda KEP alebo AdES, s tým že certifikáty a privátne podpisovacie kľúče pre vyhotovenie podpisu sú uložené na vzdialenom zabezpečenom serveri s HSM.

Remote signing musí byť implementovaný podľa vykonávacích predpisov nariadenia eIDAS a jeho implementácia mala byť v úzkom naviazaní na projekt European Digital Identity Wallet (EUDIW), kde služba vzdialeného podpisovania bola jednou z riešených streamov.

Remote signing nebol zaradený na kritickú cestu a taktiež jeho zaradenie do Programu bolo vždy ako Nice to have a jeho nedodanie neohrozuje míľniky pre Platformu a Prioritné životné situácie. Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje vyradenie Remote signing zo scope Projektu CPK zaradeného do portfólia projektov v rámci Programu.

○ Prehľad portfólia projektov s vyznačením kritickej cesty

Program pripravil Roadmapu Platformy na základe kategorizácie produktov. Roadmapa zobrazuje kritickú cestu, ktorú možno považovať za „minimálny produkt potrebný pre splnenie míľnika“ a zvyšok produktov dodávaných viacerými projektami, ktoré možno považovať za pridanú hodnotu k celej Platforme. Program musí plniť ciele dodania Platformy podľa kritickej cesty, keďže najprv je potrebné naplniť míľnik a až potom sa môže ďalej optimalizovať ostatnými komponentami. Momentálne sú najkritickejšími komponentami CAMP a MÚPVS a vyžadujú najviac pozornosti.

Link na Roadmapu Platformy: [Roadmapa Platformy-FINAL-10 2024-nakres.png](#)

3. Prehľad aktivít projektov MIRRI a NASES

V prezentácii na slideoch 12 – 14 je zobrazený prehľad aktivít jednotlivých projektov MIRRI a NASES od prípravy VO až po fakturačný míľnik.

4. Odpočet projektov - mÚPVS, CAMP, SvM, KAV

Program navrhuje neriadiť CAMP a MÚPVS ako samostatné projekty, ale ako veľmi rizikové prerekvizity. Je potrebné stretnutie na úrovni MIRRI a NASES pre ujasnenie otvorených otázok.

○ MÚPVS

MÚPVS mešká s nasadením do produkcie. V rámci produkčného prostredia je aktuálne nevypublikované v rámci siete vzhľadom na bezpečnostné nálezy z testovania, ktoré sa riešia opravou externistami z pôvodného SK IT alebo v rámci zazmluvnenia prác na SLA pre časti diela.

○ CAMP

OPZ projektu vznikne po úspešnom sfunkčnení CAMP. Jeho podmienkou je realizácia VO na malý rozvoj, ktorého vyhlásenie je plánované do konca októbra 2024. Pri integrácii core systému ÚPVS je nutné zabezpečenie súčinnosti GlobalTelu. Obsahom CAMP 2.0 je v podstate SLA, kde je časť Rozvoj financovaná z POO a časť L3 financovaná zo ŠR a zabezpečovať ju bude NASES. Je potrebné prijať rozhodnutie o spôsobe obstarávania CAMP 2.0 (kto bude obstarávateľ a kompetencie v rámci trojstrannej zmluvy).

○ **SvM**
 Hlavným rizikom SvM je chýbajúci dodávateľ a chýbajúca podpora L3.

○ **KAV**
 Aktuálne je v procese VO pre SLA na údržbu a malý rozvoj existujúceho IS. Do konca novembra 2024 sa predpokladá ukončenie VO.

5. Infraštruktúrne možnosti nasadenia komponentov

Infraštruktúrne možnosti nasadenia komponentov sú zadefinované v prezentácii na slide 21.

6. Riziká / otvorené body

Riziká a otvorené body sú zhrnuté v prezentácii na slideoch 22 – 23.

Rozhodnutia

Číslo R.	Navrhované rozhodnutia	Schválené
R_11/RV_02/2024	RV schvaľuje balík navrhnutých zmien v scope Programu (zaradenie KAV 2.0 a OOTS, vyradenie MOU, EUDIW a Remote signing).	ÁNO
R_12/RV_02/2024	RV schvaľuje prijatie kritickej cesty v rozsahu, v akom bola zadefinovaná.	ÁNO

Úlohy

Č.	Úloha	Termín	Zodpovedný	Plnenie /status
U_7/RV_02/2024	RV ukladá upraviť katalóg v zmysle schválených zmien.	15.11.2024	Daniela Mesková	NOVÁ
U_8/RV_02/2024	RV ukladá pripraviť projektový plán aktivít medzi projektami MÚPVS a CAMP s cieľom mať CAMP dostupný pre OVM 01/2025.	31.10.2024	NASES v súčinnosti CAMP MIRRI	NOVÁ
U_9/RV_02/2024	RV ukladá zavedenie koordinačnej skupiny pre nastavenie procesu objednávaní CR na staré riešenia.	15.11.2024	Roman Miškovič s aktívnou súčinnosťou NASES	NOVÁ

Semaforový status:

NOVÁ/PREBIEHA – plnenie načas a bez problémov	NOVÁ
PREBIEHA – plnenie ohrozuje prekážky	PREBIEHA
POZASTAVENÁ/NESPLNENÁ – nedodržanie termínu plnenia	NESPLNENÁ

Schválenie

Zápis zo stretnutia bol zaslaný všetkým zúčastneným a vymenovaným zástupcom. Pripomienky a návrhy k tomuto zápisu treba vzniesť do **29.10.2024**, po tomto termíne bude tento zápis považovaný za schválený.

Meno	Pripomienka

Finálny zápis zo zasadnutia riadiaceho výboru podľa článku 7 bodu 3 štatútu Riadiaceho výboru projektu **Slovensko 3.0** podpisuje a schvaľuje **Predseda Riadiaceho výboru**.

Meno a Priezvisko	Podpis predsedu
Ing. Ivan Ivančín Štátny tajomník II.	



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Program Slovensko 3.0

Riadiaci výbor



1. Zloženie RV
2. Prehľad portfólia programu
3. Prehľad aktivít projektov MIRRI a NASES
4. Odpočet projektov - mÚPVS, CAMP, SvM, KAV
5. Infraštruktúrne možnosti nasadenia komponentov
6. Riziká / otvorené body



Člen RV	Nominácia	Hlasovacie právo
Predseda RV – Štátny tajomník II	Ing. Ivan Ivančin	ÁNO
Podpredseda riadiaceho výboru	Ing. Andrej Peterka	ÁNO
Zástupca NASES	Ing. Ľubomír Mindek	ÁNO
Zástupca stratégie ITVS	Ing. et Ing. Martin Déneši, PhD.	ÁNO
Zástupca NASES za prevádzku	Ing. Ľudovít Holbík	ÁNO
Zástupca produktového portfólia	Mgr. Daniela Mesková	NIE
Zástupca IT architektúry	n/a	NIE
Zástupca dodávateľa	n/a	NIE
Zástupca portfólio manažmentu a programového manažmentu MIRRI	Mgr. Roman Miškovič	NIE
Zástupca implementácie Plánu obnovy a odolnosti	Ing. Martina Hasayová, PhD.	NIE
Programový manažér SVK 3.0	Mgr. Roman Miškovič	NIE
Programový manažér ŽS	Mgr. Roman Miškovič	NIE
Tajomník RV	Ing. Alba María Hernández	NIE


Predseda RV – Ing. Ivan Ivančin na základe štatútu riadiaceho výboru programu Slovensko 3.0 menuje do role:

- Zástupcu produktového portfólia (bez hlasovacieho práva) - Mgr. Daniela Mesková
- Zástupcu implementácie Plánu obnovy a odolnosti (bez hlasovacieho práva) - Ing. Martina Hasayová, PhD.
- Programového manažéra SVK 3.0 (bez hlasovacieho práva) - Mgr. Roman Miškovič





- Zjednodušený prístup k dátam a službám štátu na monitoring Životných situácií a zberu spätnej väzby od občanov prostredníctvom moderných BI analytických nástrojov
- Zlepšenie existujúcich a implementácia nových funkcionalít IS KAV pre podporu riešenia životných situácií, zefektívnenia úkonov zamestnancov verejnej správy pri dôslednom rozvoji princípu 1x a dosť a striktnom dodržiavaní práv občana a podnikateľa

DEUS_DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
MDSR_Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MPRVS_R_Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVRSR_Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MŠVVMSR_Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
MVSR_Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZSR_Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NCZI_Národné centrum zdravotníckych informácií
SP_Sociálna poisťovňa
ŠÚSR_Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŠVPSSR_Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
ÚGKKSR_Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
ÚVZSR_Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

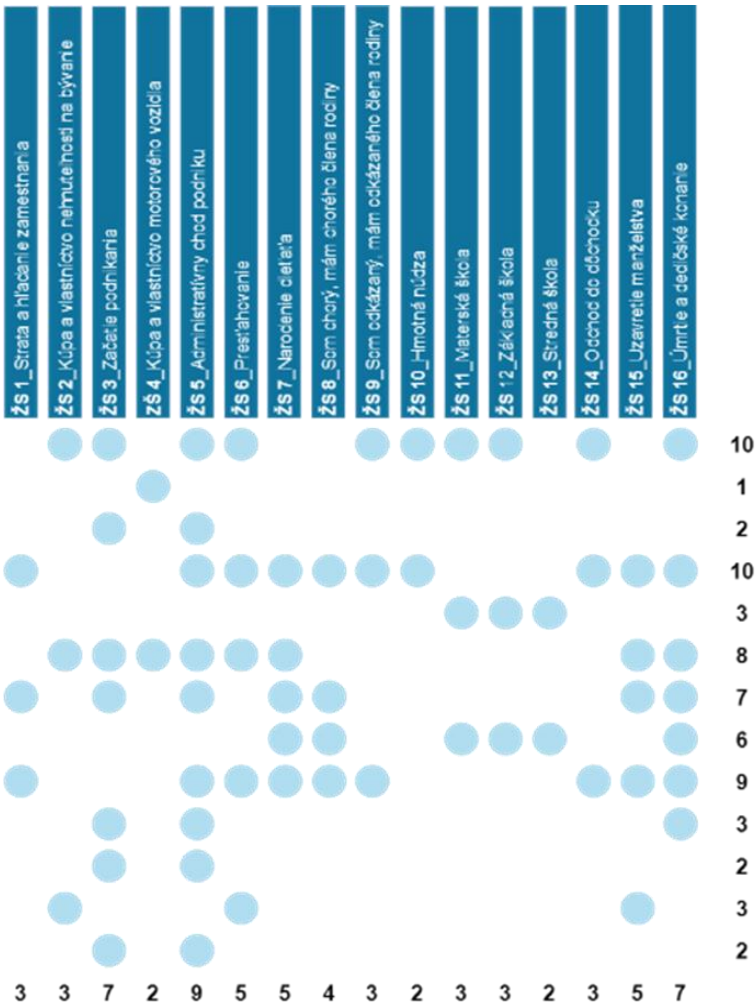

Rozhodnutie:

- Riadiaci výbor schvaľuje/neschvaľuje zaradenie projektu s názvom „KAV 2.0“ do scope-u pre budovanie Platformy pre životné situácie (programu SVK 3.0) a portfólio projektov, ktorým sa bude Platforma budovať.

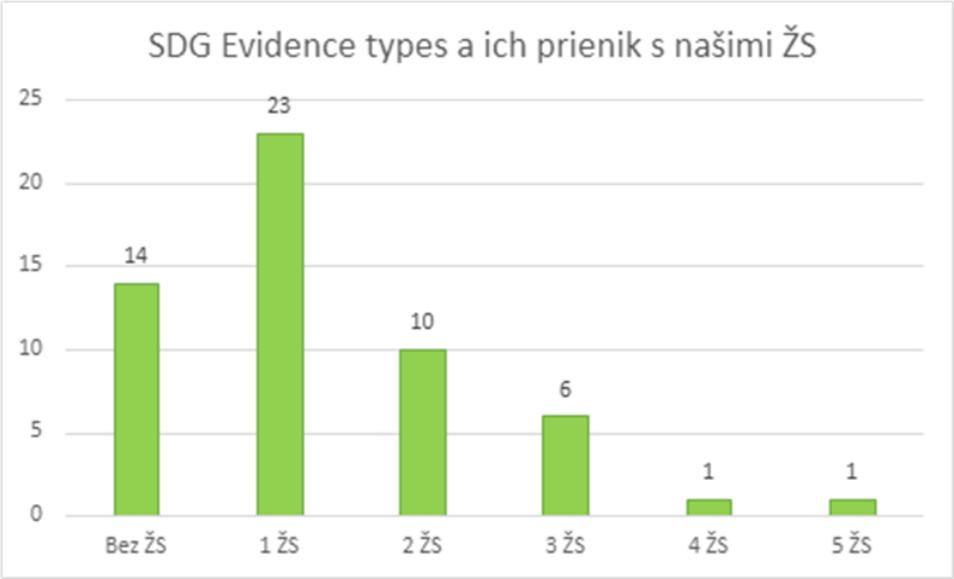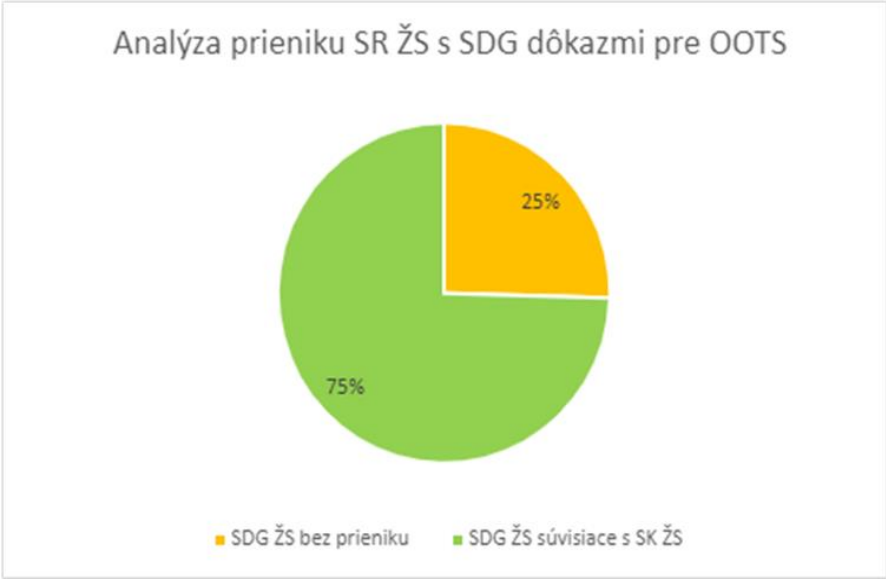

Rozhodnutie:

- Riadiaci výbor schvaľuje/neschvaľuje zaradenie projektu s názvom „*Systém "jedenkrát a dosť" ako súčasť Jednotnej digitálnej brány (OOTS)*“ do scope-u pre budovanie Platformy pre životné situácie (programu SVK 3.0) a portfólio projektov, ktorým sa bude Platforma budovať.

➤ Odôvodnenie:

- V zmysle novely zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch prešla agenda digitalizácie dokladov pod gesciu MV SR
- Začatý proces delimitácie príslušnej agendy ako aj IS MOÚ
- Ponechanie EUDIW v scope Platformy - potencionálna duplicita vývoja riešení v oblasti digitálnych dokladov
- MOÚ a EUDIW neboli zaradené na kritickú cestu a ich nedodanie neohrozuje míľniky pre Platformu a Prioritné životné situácie

V súvislosti s vyššie uvedeným navrhujeme, aby RV odsúhlasil vyradenie MOÚ a EUDIW zo scope Platformy

Rozhodnutie:

- Riadiaci výbor schvaľuje/neschvaľuje vyradenie IS MOU a EUDIW zo scope-u pre budovanie Platformy pre životné situácie (programu SVK 3.0) a portfólia projektov, ktorým sa bude Platforma budovať.



Pri Remote Signing procese ide o autorizáciu kvalifikovaného elektronického podpisu, a teda KEP alebo AdES, s tým že certifikáty a privátne podpisovacie kľúče pre vyhotovenie podpisu sú uložené na vzdialenom zabezpečenom serveri s HSM.

- Výhodou je eliminácia potreby osobného QSCD zariadenia (eID, hardverový token), inštalácie čítačky a ovládača QSCD zariadenia.

Remote signing **musí byť implementovaný podľa vykonávacích predpisov nariadenia eIDAS** a jeho implementácia mala byť v úzkom naviazaní na projekt **European Digital Identity Wallet** (EUDIW), kde služba vzdialeného podpisovania bola jednou z riešených streamov.

- V zmysle predchádzajúcich informácií k agende EUDIW Remote Signing navrhujeme vyňať z projektu Centrálny podpisový komponent (CPK), ktorého prioritnou úlohou je dodanie autorizácie funkciou prístupového miesta (AFPM) a v ďalšej fáze projektu aj plug-in CPK a autorizácie s využitím eID 2.0 cez mobilné zariadenie.
 - Remote signing nebol zaradený na kritickú cestu a taktiež jeho zaradenie do Platformy bolo vždy ako Nice to have a jeho nedodanie neohrozuje míľniky pre Platformu a Prioritné životné situácie

Rozhodnutie:

- Riadiaci výbor schvaľuje/neschvaľuje vyradenie Remote signing zo scope-u projektu CPK zaradeného do portfólia projektov budovania Platformy pre životné situácie (programu SVK 3.0) .

- Portfólio komponentov Platformy pre Životné situácie
- Kritická cesta pre naplnenie mílnika POO
- Štruktúra projektov realizácie

[Roadmapa Platformy.png](#)

Úloha:

- Riadiaci výbor ukladá upraviť katalóg v zmysle schválených zmien – zodpovedná Daniela Mesková



Program Slovensko 3.0: prehľad portfólia projektov s vyznačením kritickej cesty

Oblasť	Názov projektu	Popis	Realizátor
Autorizácia a autentifikácia	Rozvoj SVM	• Rozvoj SvM: - APP2APP - Integrácia na CPK (SDK eID 2.0, Remote signing) - Prihlásenie do SvM s eID 2.0 - integrácia na digitálny onboarding - integrácia na CNM	MIRRI
	CPK (AFPM)	Autorizácia klikom	
	CPK (eID2.0)	Autorizácia eID 2.0 (NFC KEP)	
	CPK (Remote signing)	Remote signing (v SvM)	
	Digitalny onboarding (SvM)	potrebné integrovať s SvM aby splnil "dodané"	
Tvorba, evidencia a vizualizácia elektronických správ, eDESK	Mobilná aplikácia 2	• Schránka správ v mobile: - Aktivácia schránky na doručovanie - Prevzatie doručenky • Notifikácie • Mobilné formuláre • Personalizovaný kalendár Integrácie (SvM...)	
Monitoring služieb	KAV 2.0 - Monitoring služieb pre ŽS	Monitoring dát - ŽS, ÚPVS	
	KAV 2.0 - Spätná väzba	Spätná väzba	
Elektronické zdieľanie údajov a dokumentov	OOTS	Cezhraničná výmena dôkazov (Nariadenie SDG)	
	EUDIW – mobilná aplikácia	Doklady v mobile	
	MOU 2.0	MOU pre ŽS	
Integrácie	Funkčný rozvoj CSRÚ 2.0	Rozvoj platformy	
	Dátové integrácie pre ŽS	Dátové integrácie	
	CAMP 2.0	Centrálna API manažment platforma -pre ŽS a Platformu	
Tvorba, evidencia a vizualizácia elektronických správ, eDESK	Aktivácia schránky na doručovanie		
Návody	Interaktívny sprievodca	MVP	
	Interaktívny sprievodca	Rozvoj	

Program Slovensko 3.0: prehľad portfólia projektov s vyznačením kritickej cesty

Oblasť	Názov projektu	Popis	Realizátor
Platobný modul	Katalóg súdnych a správnych poplatkov	Platba v procese podania	NASES
Správa identít	IAM 3.0 (Identity and Access management)	Manažment prístupov a identít, Úložisko údajov o identite vrátane kontaktných údajov Migrácia a synchronizácia identít zo zdrojových registrov Integračné služby pre IAM 3.0	
	Zastupovanie/oprávnenia identity	Zmena prístupu k prideľovaniu zastupovaní /kontextu identity	
	Portfólio a profil klienta 2.0	Doplnenie možnosti spravovať zastupovania/oprávnenia, kontext identity (všetkých typov a podtypov) v rámci profilu klienta	
	Stotožňovanie cudzincov (EIDAS3 okruh2)	Stotožňovanie a synchronizácia cezhraničných používateľov pri používaní rôznych autentifikačných prostriedkov (RFO a IAM 3.0)	
Tvorba, evidencia a vizualizácia elektronických správ, eDESK	eFORM dizajnér a filler pre elektronické služby v životných situáciách	Dizajnovanie vzoru formulára pre elektronickú službu v responzívnom dizajne Vypíňací komponent formulára (FILLER) s integráciou na číselníkový modul a iné zdroje dát Generovanie registrovateľného balíčka vzoru formulára	
	Lokátor služieb 3.0	Výber elektronickej služby, vrátane jej parametrov/atribútov podľa požiadaviek životnej situácie	
	Konštruktor správy a integrácie na CPK a MEP (eshopový spôsob platby)	Konštruktor správy na vytváranie elektronických správ v zmysle eGov Integrácia na Centrálny podpisový komponent (podpisovanie v mobile) Implementovaný eshopový spôsob platby (integrácia na MEP) v procese vypĺňania podania	
	eDESK 3.0	Vytvorenie a migrácia DB eDESK, vrátane služieb publikovaných na rozhranie pre aplikácie, ktoré sú integrované na služby nad správami Možnosť ukladania nadlimitných správ (napr. exekučné) Grafické rozhranie na komfortnejšiu prácu so správami	
	CEP 3.0	Zaevidovanie elektronickej správy v elektronickej podateľni prostredníctvom centrálnych mikroslužieb	
	Centrálny notifikačný modul - Notifikácie v kontexte životných situácií	Možnosť generovania rôznych typov notifikácií na základe definovaných šablón v životných situáciách podľa kontaktných kanálov identity	

Oblasť	Názov projektu	Popis	Realizátor
Orchestrácia procesov životných situácií a elektronickej komunikácie v štáte	Centrálna zbernica udalostí pre zbieranie vstupov do procesov	Zbieranie vstupov do procesov životných situácií Prijímanie eventov do procesov	NASES
	Orchestračná platforma vrátane modulu pre konfiguráciu a modelovanie procesov	Modul pre konfiguráciu a modelovanie procesov Nadizajnovanie procesov, vrátane ich pravidiel s použitím low code prístupu, zvýšenie priepustnosti spracovania správ v procese Zabezpečenie orchestrácie podľa pravidiel konfigurácie pre proces	
	Pilotný proces spracovania notifikácie (eventu) z OVM	Spracovanie notifikácie na základe eventu z OVM pre vybraný proces prioritnej životnej situácie a následnej aktivity smerom k občanovi	
	Konfigurácia procesov životnej situácie pre prioritné životné situácie	Nakonfigurovanie prioritných životných situácií, vrátane pravidiel procesov	
	Konfigurácia procesov elektronickej komunikácie so štátom v ÚPVS	Nakonfigurovanie procesov elektronickej komunikácie so štátom, vrátane pravidiel procesov	
Konsolidácia kvalifikovaných dôveryhodných služieb štátu v NASES	Centralizácia KDS poskytovaných NASES a ich poskytnutie OVM vrátane obmeny infraštruktúry pre splnenie požiadaviek auditu	Centralizácia kvalifikovaných dôveryhodných služieb štátu a vytvorenie jednej kvalifikovanej dôveryhodnej certifikačnej autority v rámci informačných systémov Centralizácia poskytovania technických certifikátov pre potreby štátu a vytvorenie jednej dôveryhodnej certifikačnej autority pre ich vydávanie	
Optimalizácia prevádzkovej platformy SVK 3.0	Optimalizácia prevádzkovej platformy SVK 3.0 Implementácia služieb na vrstve Iaas, PaaS, SaaS pre tenant, vytvorenie DEV/UAT/PREPROD/PROD, DevOps, implementácia princípov automatizácie Infrastructure As a Code (IaaS), HW platforma DC NASES	Rozšírenie existujúcej kapacity pre projektové výstupy programu SVK 3.0 - rozšírenie pre SBC simultánne licencie (SaaS služba pre OVM) - sieťové zariadenia, IPS, DDoS lic, whitess server - rozširovanie služieb pre podporu OVM (workplace manažment)	

Kritická cesta

Projekt	Časti podľa VO	Fázy	8.24	9.24	10.24	11.24	12.24	1.25	2.25	3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25	9.25	10.25	11.25	12.25	1.26	2.26	3.26	Informácia o stave		
CPK	• Autorizácia klikom • Mobilná autirizácia ID2.0	Príprava VO																						• Stav: prebieha PTK • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 1.000.000 € • Obstaranie prevádzky: súčasť VO • Linka na dokumenty VO: <u>TBD</u>	
		Proces VO																							
		Podpis zmluvy																							
		Realizácia: AFPM																							
		Fakturačný míľnik: AFPM																							
		Realizácia: eID2.0																							
		Fakturačný míľnik: eID2.0																							
	• Remote signing	Príprava VO																							• Stav: on hold • Typ VO: TBD • Suma VO: TBD • Obstaranie prevádzky: súčasť VO • Linka na dokumenty VO: <u>TBD</u>
		Proces VO																							
		Podpis zmluvy																							
		Realizácia																							
		Fakturačný míľnik																							
Digitálny onboarding	• SDK + integrácie	Príprava VO																						• Stav: prebieha PTK • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 500.000 € • Obstaranie prevádzky: súčasť VO • Linka na dokumenty VO: <u>TBD</u>	
		Proces VO																							
		Podpis zmluvy																							
		Realizácia																							
		Fakturačný míľnik																							
Rozvoj SvM	• APP2APP • Integrácia na CPK • Prihlásenie s eID 2.0 • integrácia na digitálny onboarding a CNM	Príprava VO																						• Stav: on hold • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 2.500.000 € • Obstaranie prevádzky: súčasť VO (3 roky) • Linka na dokumenty VO: <u>TBD</u>	
		Proces VO																							
		Podpis zmluvy																							
		Realizácia																							
		Fakturačný míľnik																							
Mobilná aplikácia 2	• Schránka správ • Notifikácie • Mobilné formuláre • Personalizovaný kalendár	Príprava VO																						• Stav: on hold • Typ VO: TBD • Suma VO: 2.000.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: <u>TBD</u>	
		Proces VO																							
		Podpis zmluvy																							
		Realizácia																							
		Fakturačný míľnik																							
KAV 2.0	• Spätná väzba • Monitoring dát - ŽS, ÚPVS	Príprava VO																						• Stav: príprava PTK • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 3.500.000 € + 2.000.000 € • Obstaranie prevádzky: súčasť VO (3 roky) • Linka na dokumenty VO: <u>TBD</u>	
		Proces VO																							
		Podpis zmluvy																							
		Realizácia: Základná funkčnosť																							
		Realizácia: Pilotné ŽS																							
		Realizácia: Full scope																							
		Fakturačný míľnik																							



Projekt	Časti podľa VO	Fázy	8.24	9.24	10.24	11.24	12.24	1.25	2.25	3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25	9.25	10.25	11.25	12.25	1.26	2.26	3.26	Informácia o stave	
OOTS	• Cezhraničná výmena dôkazov	Príprava VO																						• Stav: príprava VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 2.000.000 € • Obstaranie prevádzky: súčasť VO (2+2) • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
Funkčný rozvoj CSRÚ 2.0	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: schvaľovanie projektu PK • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 5.300.000 € • Obstaranie prevádzky: súčasť VO (3 roky) • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
	• Dátové integrácie	Realizácia																						• Typ VO: Dodatok k Zmluve o dielo - DI • Suma VO: 4.000.000 €
		Príprava dodatku																						
		Realizácia																						
	CAMP 2.0	• Rozvoj platformy	Proces VO																					
Podpis zmluvy																								
Realizácia																								
Príprava VO																								
Proces VO																								
Podpis zmluvy																								
Realizácia																								
Fakturačný míľnik																								
Aktivácia schránky na doručenie	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: on hold • Typ VO: TBD • Suma VO: TBD • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
Interaktívny sprievodca	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: príprava VO • Typ VO: Podlimit • Suma VO: 60.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						



Program Slovensko 3.0: prehľad portfólia programu - VO projektov NASES

Projekt	Časti podľa VO	Fázy	8.24	9.24	10.24	11.24	12.24	1.25	2.25	3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25	9.25	10.25	11.25	12.25	1.26	2.26	3.26	Informácia o stave	
IAM3.0	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Pozastavené • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 2.100.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
rPAP	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Príprava VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 1.700.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
eIDAS 3	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Príprava VO • Typ VO: Podlimit • Suma VO: 200.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
DLK	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Prebieha VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 2.500.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
eDESK 3.0	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Príprava VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 1.700.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
CEP	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Príprava VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 1.300.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
CNM	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Prebieha VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 500.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
COP	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Príprava VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 4.000.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
KDS	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Príprava VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 7.000.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						
OPP	• Rozvoj platformy	Príprava VO																						• Stav: Príprava VO • Typ VO: Nadlimit • Suma VO: 5.000.000 € • Obstaranie prevádzky: TBD • Linka na dokumenty VO: TBD
		Proces VO																						
		Podpis zmluvy																						
		Realizácia																						
		Fakturačný míľnik																						



ID	Akronym	Celý názov /podľa VO	Stav VO			Aktuálny Deadline	Predpokladaný začiatok realizácie	Poznámky
			PTK	PHZ	Súťaž			
SVK3 - 01	IAM 3.0	Autentifikácia, autorizácia, správa a zastupovanie identít		G	R			Príprava súťažných podkladov
SVK3 - 02	rPAP	Rozvoj PAP - Portfólio a profil klienta 2.0		A		1.11.2024	1.3.2025	Čakanie na objednávku súčinnosti Pactum Park. Predpoklad vypísania PHZ 1.11.2024
SVK3 - 03	eIDAS 3 č.II.	Jednotná digitálna brána - služby národného eIDAS uzla a ÚPVS časť II.		G	G		1.9.2024	Súťaž ukončená, prebieha realizácia
SVK3 - 04	DLK	Dizajnér, filler, konštruktor správ a rozpracovaných podaní a lokátor služieb pre formuláre elektronických služieb v životných situáciách		G	A	5.11.2024	1.2.2025	Prebieha súťaž. Release 1 - Termín dodania 31.3.2025
SVK3 - 05	eDESK 3.0	eDESK 3.0	A					Prebieha vyhodnotenie PTK. GT na základe výzvy dal ponuku na súčinnosť. V riešení je spôsob obstarania - predpoklad je PRK - výber súdneho znalca
SVK3 - 06	CNM	Notifikácie v kontexte životných situácií – Centrálny notifikačný modul		G	A	28.10.2024	1.12.2024	Prebieha súťaž. Release 1 - termín dodania 31.3.2025
SVK3 - 07	CEP 3.0	Centrálna elektronická podateľňa 3.0		G		25.10.2024	1.3.2025	Vyhodnocujú sa odpovede na PHZ, doručené 10.10. Súťaž bude vypísaná do 25.10.2024
SVK3 - 08	COP/CZU	Centrálna orchestračná platforma pre životné situácie a Centrálna zbernica udalostí		G		21.10.2024	1.2.2025	Ukončené PHZ. Súťaž bude vypísaná do 21.10.2024
SVK3 - 09	KDS	Konsolidácia certifikačných autorít		A		22.10.2024	1.2.2025	Vyjasňovanie a finalizácia zadania do PHZ. Predpoklad vypísania PHZ 22.10.2024
SVK3 - 10	OPP	Optimalizácia prevádzkovej platformy		A	A	1.11.2024	Priebežne do konca 2025	Dodávky HW/SW prevažne cez DNS. Prebieha inštalácia COS (do 1.11.2024). Príprava PHZ na KLIS (Klienstký IS) - pokrýva CRM a DWH. Dodávky priebežne v 2025

Nasadenie MÚPVS / Stav modulov

- MÚPVS je nasadené na prostredí UAT/PROD NASES. Odoslaný reklamačný list a zoznam identifikovaných reklamačných vád listom na spoločnosť Slovensko IT v 07/2024. V rámci PROD prostredia, je aktuálne nevypulikované v rámci siete vzhľadom na bezpečnostné nálezy z testovania, ktoré sa riešia opravou externistami z pôvodného SK IT alebo v rámci zazmluvnenia prác na SLA pre časti diela.

MÚPVS a prevádzka

- MÚPVS v pilotnej prevádzke (bez prístupu externých užívateľov) do doby:
 - odstránenia identifikovaných záručných vád a zraniteľnosti riešenia
 - zvýšenia úrovne potrebných znalostí u zamestnancov prevádzky NASES
 - reimplementácie a stabilizácie prevzatého vývojového prostredia dodávateľa SKIT – GitLab, runner...
 - nasadenia IS CAMP vrátane zmeny použitia IOMO role na technické účty a podpory pre integračné procesy
- Prebieha obstaranie SLA pre moduly MÚPVS (finalizácia príprava podkladov na obstarávanie SLA a stanovenie PHZ).

Aktuálny stav

- Nasadené v pilotnej prevádzke (na prostredí UAT)
- Vytvorený PROD, zatiaľ však nie plne funkčný - riešime s NASES
- Riziko: Zraniteľnosť systému – z pohľadu kyberbezpečnosti - je potrebné realizovať opatrenia, plánované cez SLA
- Dočasná SLA a malý rozvoj pre stabilizáciu na preklenovacie obdobie
 - Predpoklad vyčerpania do 6 mesiacov
 - NASES obstaraná SLA (L3 a L2, financovanie z RZ)
 - Príprava VO, malý rozvoj v MIRRI (financovanie z OP) „malá“ SLA

Plán

- **KRITICKÉ RIZIKO: Riešenie problému súčinnosti dodávateľa ÚPVS pre integráciu CAMP na služby ÚPVS, na úrovni vedenia MIRRI a GlobalTelu**
- Realizácia prioritných rozvojových požiadaviek a zraniteľnosti (pre zabezpečenie efektívnej prevádzkyschopnosti CAMP) - v rámci SLA na malý rozvoj
- V spolupráci s NASES dokončenie prípravy procesov integrácie OVM na pripájanie na CAMP
- Príprava VO na dlhodobú SLA pre CAMP 2.0

Úloha:

- Riadiaci výbor ukladá pripraviť projektový plán aktivít medzi projektami mÚPVS a CAMP do 31.10.2024 s cieľom mať CAMP dostupný pre OVM 01/2025 - zodpovedný NASES v súčinnosti CAMP MIRRI.



Úloha z RV Slovensko 3.0 udelenej 14.5.2024

„Riadiaci výbor ukladá úlohu GR NASES pripraviť proces integrácie tretích strán (OVM) na CAMP a zabezpečiť podmienky pre integráciu OVM zapojených do budovania Životných situácií v rámci POO – I1R1“

Kľúčový problém pre integráciu:

- CAMP – autentifikácia prostredníctvom JWT token (vydávaných v Slovensko v Mobile pre koncového používateľa, pre aplikáciu vydané z CAMP)
- Súčasný ÚPVS - autentifikácia prostredníctvom SAML
- Riešenie (preklad autentifikačných tokenov SAML a JWT) - vyžaduje úpravy ÚPVS súčasným dodávateľom (GlobalTel)
- GlobalTel zaslal oficiálne stanovisko, že nedodá funkčnosť prekladu JWT tokenov CAMP do SAML
 - Neoficiálne deklarovali ako dôvod aj nezaplatenú etapu testovanie projektu MÚK-P z roku 2020 (v hodnote 340 tis. EUR)
 - Otvorený súdny spor s NASES
 - V rámci diskusie tiež namietali nesúlads CAMP so zákonom o e-Governmente, nakoľko:
 - autentifikačné JWT tokeny by mal vydávať autentifikačný modul IAM
 - do budúcnosti aj IAM v SVK 3.0 bude vydávať vlastné JWT tokeny
 - nie je vhodné vydávanie tokenov na dvoch miestach – v CAMP aj v IAM.

Popis	Odhad nákladov (EUR)	Odhad trvania	Charakter riešenia	Odporúčanie
Úprava ÚPVS a CAMP - zabezpečenie prekladu JWT tokenov - Vyžaduje súčinnosť GlobalTel	Úpravy UPVS - 300 tis. Úpravy CAMP - 100 tis.	Celkom 15 (9 + 6) mesiacov	Trvalé	Odporúčané trvalé riešenie
Spustiť služby ÚPVS v CAMP s využitím role R_PREVADZKOVATEL_IOM: - dokončiť implementáciu bezpečnostných pravidiel v CAMP voči ÚPVS - zrealizovať pravidelný audit dôveryhodných služieb	Úpravy CAMP - 100 tis. Audit – 10 tis.	Celkom 11 (9 + 2) mesiacov	Dočasné	Odporúčané dočasné riešenie
Úpravy MUPVS, KSDR, POZ-ZK tak, aby využívali SOAP služby ÚPVS namiesto REST služieb z CAMP - „Obchádza“ CAMP	Úpravy KSDR – 50 tis. Úpravy POZ-ZK – 70 tis.	3 mesiace	Dočasné	Neodporúčané
Realizácia „prekladacieho modulu“ Globaltelom prekladal REST volaní z MUPVS/POZ-ZK voči CAMP do SOAP volaní voči ÚPVS - „Obchádza“ CAMP - Vyžaduje súčinnosť GlobalTel	100 tis.	9 mesiacov	Dočasné	Neodporúčané

Aktuálny stav

IS KAV - IS KAV je centrálnym komponentom na získavanie, spracovanie, transformáciu, spájanie, ukladanie a vizualizáciu dát (Centrálné Štátne BI)

IS Konsolidovanej analytickej vrstvy (KAV) predstavuje zásadný krok k zlepšeniu možností a schopností analytických jednotiek vykonávať svoju činnosť a k vytvoreniu možností pre lepšiu podporu využitia analytických údajov v rozhodovacích procesoch celej verejnej správy. Ide o dôležitý komponent pre digitálnu transformáciu verejnej správy, ktorý umožní výrazne zlepšiť rozhodovanie a inovovať samotné fungovanie výkonu jednotlivých agend. IS KAV rozširuje koncept pre zavádzanie analytického spracovania údajov do praxe pre zlepšenie využívania údajov a štátom vlastnených dát vo verejnej správe, najmä aby sa štát rozhodoval na základe dát a nie pocitov (takzvaný koncept vlády fungujúcej na základe znalostí – „Data-driven Government“).

IS KAV je prevádzkovaný na MIRRI a jeho správcom a administrátorom je Business Vlastník KAV 2.0 - Ľ. Gabaj

Plán

V procese VO je SLA na údržbu a malý rozvoj existujúceho IS.

- Predpoklad ukončenia VO je November 2024
- Celková výška PHZ 140 000 eur bez DPH, hrazené bude zo ŠR z toho: Rozvoj IS celkovo 100 tis., Podpora 40 tis.
 - Čerpanie v 2024: 70 tis (z toho Rozvoj 50 tis.)
 - Čerpanie v 2025: 70 tis (z toho Rozvoj 50 tis.)

Alternatíva	Dostupnosť	Perspektíva	Kapacita pre SVK 3.0
Existujúce ÚPVS prostredie	ihneď	Ukončiť ASAP	0
Hyperflex	ihneď	Nahradiť 2026	20%
Oracle Private Cloud Appliance	Q1/2025	2027	100 % +
Dedicated Openshift Platform	H2/2025 (treba obstarat')	2030	100 % +

Oblasť	Popis	Dopad	Mitigácia	Vlastník
MUPVS	Meškanie s nasadením mUPVS do produkcie alebo len čiastočný scope	Nejasný scope pre ďalší rozvoj pre centrálné komponenty a realizáciu požiadaviek ŽS	Zadefinovať finálny scope – nasadený do produkcie	NASES
CAMP	- Meškanie s nasadením CAMP do produkcie alebo len čiastočný scope - Nedoriešená bezpečnosť - Nedoriešené úplné alebo čiastočné zastupovanie organizáciou - SLA stále v riešení VO	Neúplné informácie pre spôsob využitia pre ďalší rozvoj pre centrálné komponenty a realizáciu požiadaviek ŽS	- Nasadenie do produkcie v odsúhlasenom termíne (závislosť na SvM, ÚPVS a súčinnosti jeho dodávateľa) - Workaround – priama integrácia OVM na moduly (CZU, CNM) - Schválenie a podpis SLA a rozvoj - potrebné realizovať opatrenia zabezpečujúce požadovanú úroveň kyberbezpečnosti cez SLA	- SITVS/ oSBATA - NASES
SvM podpora a rozvoj	- Chýbajúci dodávateľ za oblasť SvM - Chýbajúca podpora L3 - Riadené ukončenie SKITu - Neprehľadné zdrojové kódy - Nedokončený bezpečnostný projekt	- Otázna udržateľnosť a podpora SvM vzhľadom na ESIF požiadavky - Ohrozenie záväzkov voči iným ministerstvám (MVSR)	- Zabezpečenie podpory - Zabezpečenie dodávateľa - Zadefinovanie stratégie s aplikáciou - Celková revízia kvality riešenia	MIRRI
Medzi projektové/ modulové závislosti	Aktuálne absentuje detailná analýza závislostí z pohľadu architektúry	- Nenaplnenie požadovaného scope - Možné zmenové požiadavky	Detailná analýza na úrovni architektúry komponentov	SITVS/ oSBATA
Prístup do eDesk natívne cez novú mobilnú aplikáciu	Neprešlo na ARB - odporúčanie neriešiť navítny prístup do eDesk, ale počkať na dodanie responzívneho prostredia (projekt eDesk 3.0 s predpokladom dodania Q1/2026)	Prístup do eDesk z mobilného zariadenia bude dostupný až v priebehu roka 2026	Návrh nového riešenia a prístupu k realizácii - schválenie projektovou komisiou predpokladáme do 31.10	MIRRI



Oblasť	Popis	Dopad	Mitigácia	Vlastník
OOTS	Hrozba infringementu zo strany EK pre neplnenie povinností SR vyplývajúcich z článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1724	Zahájenie konania voči SR pred Súdnym dvorom EÚ, ktorého výsledkom bude uloženie pokuty	Akcelerácia realizácie jednotlivých fáz projektu	SDA
IS CPDI	- Nedostatočné personálne kapacity - Nevyhodnotené VO na SLA	- Kritické riziko ohrozenia projektu - Vysoké riziko podpory projektu	- Zabezpečenie HR - Včasné vyhodnotenie VO	- NASES - MIRRI
ÚPVS	Vzhľadom na meškanie projektu mÚPVS, je potrebné implementovať zmeny aj do ÚPVS a následne tieto upraviť na mÚPVS	- Kritické riziko ohrozenia projektu - Zvýšené náklady na implementáciu	- Zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci zmluvy medzi NASES a MIRRI - Čo najskoršie nasadenie mÚPVS	- NASES - MIRRI
Medzi projektové závislosti	Nesúčinnosť spoločnosti GlobalTel, a.s	Kritické riziko ohrozenia projektov a dodania platformy	Rokovania na úrovni vedenia MIRRI, NASES a GlobalTel	- NASES - MIRRI
Medzi projektové závislosti	Finančné pokrytie zmien na staré riešenia - Globaltel, Ditec za projekty MIRRI ako aj niektoré zmeny pri projektoch NASES	Zvýšené náklady na implementáciu	Rokovania na úrovni vedenia MIRRI, NASES a GlobalTel	- NASES - MIRRI

Úloha:

- Riadiaci výbor ukladá zavedenie koordinačnej skupiny pre nastavenie procesu objednávania CR na staré riešenia – zodpovedný Roman Miškovič s aktívnou súčinnosťou NASES

ĎAKUJEME!

www.mirri.gov.sk



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

