



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KÓPLA

Číslo záznamu: 074606/2025

Slovensko 3.0: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií

(Zápis zo zasadnutia Riadiaceho výboru)

Účastníci

Vedúci stretnutia:	Roman Bíro				
Účel stretnutia:	Zasadnutie Riadiaceho výboru programu Slovensko 3.0: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií			Trvanie	40 min.
Miesto stretnutia:	Zasadacia miestnosť Hont 23.31	Dátum	22.09.2025	Čas	15:30
Meno a Priezvisko:	Pozícia v programe:			OVM	
Prítomní s hlasovacím právom:					
Otto Szöke (ako splnomocnenec zastupujúci p. Radoslava Štefánka)	Splnomocnenec na zastupovanie predsedu Riadiaceho výboru			MIRRI SR	
Otto Szöke	Zástupca stratégie ITVS			MIRRI SR	
Jana Molnárová	Zástupca NASES			NASES	
Michal Ďurajka	Zástupca NASES za prevádzku			NASES	
Prítomní bez hlasovacieho práva:					
Daniela Rojková	Zástupca produktového portfólia			MIRRI SR	
Radovan Vargic	Zástupca NASES za riadenie projektov			NASES	
Roman Bíro	Programový manažér SVK 3.0			MIRRI SR	
Mariana Širilová	Programový manažér ŽS			MIRRI SR	
Alba María Hernández	Tajomník RV			MIRRI SR	
Miriám Kováčiková	Prizvaný člen			MIRRI SR	
Klára Niko	Prizvaný člen			MIRRI SR	
Martina Hilčíková	Prizvaný člen			MIRRI SR	
Jozef Koža	Prizvaný člen			NASES	
Petra Šramko	Prizvaný člen (online)			MIRRI SR	
Timea Bugárová	Prizvaný člen (online)			MIRRI SR	
Katarína Chovancová	Prizvaný člen (online)			MIRRI SR	
Milan Patráš	Prizvaný člen (online)			MIRRI SR	
Mário Kulašík	Prizvaný člen (online)			NASES	
Simona Mazúch	Prizvaný člen (online)			NASES	
Kamil Smetana	Prizvaný člen (online)			NASES	
Karol Flak	Prizvaný člen (online)			NASES	
Tereza Málková	Prizvaný člen (online)			NIKA	
Patrik Kováč	Prizvaný člen (online)			NIKA	

Agenda

1. Zloženie Riadiaceho výboru
2. Sumár rozhodnutí per rollam od ostatného zasadnutia Riadiaceho výboru
3. KPI Platformy, aktivity
4. Sprístupnenie platformy – míľnik 176
5. Stav verejných obstarávaní
6. Využitie Centrálnych komponentov zo strany orgánov verejnej moci
7. Masterplán / financie
8. Aktualizácia Centrálného katalógu biznis požiadaviek
9. Vstup za NASES
10. Vyjadrenie SIPI k finančnému ukončeniu projektov
11. Riziká
12. Úlohy
13. Rôzne

Priebeh zasadnutia

- V úvode stretnutia tajomníčka Riadiaceho výboru (ďalej len „RV“) informovala členov o priebehu štvrtého zasadnutia RV programu Slovensko 3.0: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií (ďalej len „Platforma“). Cieľom zasadnutia je informovať o stave Platformy a jej komponentov s dôrazom na stav verejných obstarávaní.
- Na zasadnutí sú prítomní 4 členovia RV s hlasovacím právom, z toho predsedu zastupuje z dôvodu jeho iných pracovných povinností splnomocnenec p. Otto Szöke na základe písomného splnomocnenia, ktoré je priložené k tomuto zápisu. V súlade s čl. 6 bodom 3 a bodom 5 písm. e) Štatútu RV sa RV považuje za uznášaniaschopný.
- Tohto zasadnutia sa zúčastňujú dvaja zástupcovia Národnej implementačnej a koordinačnej authority (ďalej len „NIKA“) prostredníctvom hovoru cez platformu MS Teams.

1. Zloženie Riadiaceho výboru

- Prítomným boli oznámené zmeny v zložení RV. Novými menovanými členmi RV sú:
 - zástupca stratégie ITVS Ing. Otto Szöke (člen s hlasovacím právom);
 - zástupca SDA Ing. Anton Jelenčiak (člen bez hlasovacieho práva);
 - zástupca NASES za riadenie projektov Mgr. Radoslav Vargic (člen bez hlasovacieho práva);
 - programový manažér SVK 3.0 Mgr. Roman Bíro (člen bez hlasovacieho práva);
 - programový manažér ŽS Ing. Mariana Širilová (člen bez hlasovacieho práva);
 - zástupca implementácie Plánu obnovy a odolnosti: Mgr. Aneta Pekarčíková (člen bez hlasovacieho práva).
- Rola podpredsedu RV je momentálne neobsadená vzhľadom na ukončenie pôsobenia Mgr. Romana Miškoviča na MIRRI. Vzhľadom na poverenie Ing. Otta Szökeho riadením sekcie SIREs je Ing. Szöke nominovaný za podpredsedu RV, avšak ešte nebol do tejto role menovaný predsedom RV podľa čl. 4 bodu 8 Štatútu.

2. Sumár rozhodnutí per rollam od ostatného zasadnutia Riadiaceho výboru

- Na snímkach č. 4 – 5 priloženej prezentácie je prehľad všetkých per rollam hlasovaní od ostatného zasadnutia RV spolu s ich výsledkami. Ku dňu konania zasadnutia RV boli schválené aj zostávajúce 2 hlasovania uvedené na snímke 5 ako prebiehajúce hlasovanie.



3. KPI Platformy, aktivity

- Prítomným boli predstavené aktuálne platné ciele Platformy v zmysle snímky č. 6 priloženej prezentácie. Aktuálne prebieha revízia týchto cieľov, tzv. simplifikácia. Po revízii sa navrhuje zlúčenie cieľov a míľnikov do cieľa 175 (pre Platformu a program Budovanie prioritných životných situácií dokopy).
- Zdôraznili sa prebiehajúce stretnutia kvôli dodávkam centrálnych komponentov na orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“).

4. Sprístupnenie platformy – míľnik 176

- Odpočet vykonaný v rámci kontroly zo strany Európskej komisie (ďalej len „EK“) je uvedený na snímke č. 8 priloženej prezentácie.

5. Stav verejných obstarávaní

- NIKA aj EK monitorujú stav verejných obstarávaní, preto bolo prítomným v zmysle snímok č. 9 – 10 odprezentované, v akom stave sa predmetné verejné obstarávania nachádzali ku dňu 01.09.2025. Od tohto dátumu však došlo k ďalším posunom termínov, keďže pri niektorých projektoch sa termíny kontinuálne posúvajú.

6. Využitie centrálnych komponentov zo strany orgánov verejnej moci

- Na snímke č. 11 je zobrazený prehľad plánovaného využívania jednotlivých komponentov zo strany OVM zapojených do programu Budovania prioritných životných situácií v rámci Investície 1/K17. V tejto súvislosti prebehla na zasadnutí krátka diskusia k využívaniu zo strany Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK“). ÚGKK predložil revidovaný implementačný plán, na základe ktorého bude komponenty využívať aj napriek posunu spôsobenému výpadkom katastra.“
- Zo zasadnutia RV programu Budovanie prioritných životných situácií vzišla úloha revidovať aktivity súvisiace s naintegrovaním agendových systémov jednotlivých OVM na komponenty centrálnej Platformy. Momentálne MIRRI organizuje stretnutia s konkrétnymi OVM a s NASES k technickým riešeniam a k mitigácii rizík, ktoré vznikli v dôsledku posunom v harmonogramoch projektov Platformy.
- Eskalácie a riziká pri dodaní centrálnych komponentov zo strany OVM, ako aj ich využitie, sú uvedené na snímkach č. 12 – 13 priloženej prezentácie.

7. Masterplán / financie

- Sledovanie riadenia financií nielen pre Platformu, ale aj pre celý Plán obnovy a odolnosti v gescii MIRRI a NASES, je zobrazené formou grafov na snímke č. 13. Stav bol aktuálny k 12.09.2025. Aktualizácia Masterplánu prebieha na týždennej báze na základe vstupov od projektových manažérov. Snímky č. 14 – 15 zobrazujú finančné riadenie na základe rozdelenia projektov medzi gesciu MIRRI a NASES.
- Sledovanie riadenia financií v gescii NASES je skreslené, nakoľko s verejnými obstarávaniami o dielo nie sú vo väčšine prípadov paralelne súťažené SLA na prevádzku, a preto sumy s dopadom na štátny rozpočet do ďalších rokov sú skreslené.

8. Aktualizácia Centrálného katalógu biznis požiadaviek

- RV bol informovaný o aktualizácii Centrálného katalógu biznis požiadaviek, ktorý sumarizuje požiadavky za všetky projekty v gescii MIRRI aj NASES v rámci Platformy. Požiadavky v tomto katalógu nie sú tak detailne rozpracované, ako v katalógoch jednotlivých projektov, ale majú biznisový prínos a vychádza z nich aj produktový zoznam požiadaviek. Jednotlivé projektové katalógy požiadaviek obsahujú rozpad na funkčné detailné požiadavky. Link na aktualizovaný Centrálny katalóg biznis požiadaviek je uvedený na snímke č. 17 priloženej prezentácie.
- MIRRI navrhuje z Centrálného katalógu biznis požiadaviek vylúčiť biznisové požiadavky pre Mobilnú aplikáciu MIRRI a tým aj tento komponent z Platformy.



9. Vstup za NASES

- Vstup za NASES je zobrazený na snímke č. 18 priloženej prezentácie. NASES žiada o hlasovanie za 2 predložené body:
 - Plán práce projektového tímu;
 - Produktový zoznam požiadaviek.
- Splnomocnenec zastupujúci predsedu RV navrhol, aby predmetom tohto zasadnutia bolo hlasovanie len o Pláne práce projektového tímu, keďže naštudovanie materiálov k Produktovému zoznamu požiadaviek si vyžaduje viac času.
- Produktový zoznam požiadaviek je doplnený a z toho vzniká potreba navýšenia finančného krytia o sumu navyšujúcu 24 mil. € bez DPH – zástupcovia NASES sa vyjadrili k dôvodu požiadavky na navýšenie: gro tohto navýšenia predstavujú projekty KaVP (Kontajnerizačná a Virtualizačná platforma) a IAM. Suma navýšenia vyplýva z nového vypočítania predpokladanej hodnoty zákazky týchto projektov. Stanovisko vecnej sekcie: Táto zmena zatiaľ nebola predmetom validácie na pracovnej úrovni ani na úrovni programového riadenia Platformy a nebola predložená ani schválená na Architektonickej komisii MIRRI, kde primárne tieto témy patria.
- Vecná sekcia momentálne nemôže poskytnúť stanovisko k predmetnej zmene, keďže návrh riešenia neprechádzal štandardným procesom validácie a schválenia. Navýšenie priameho vyzvania k Investícii 1 je potrebné procesovať podľa pravidiel, ktoré nastavila NIKA pre vykonávateľa s adekvátnym zdôvodnením a opisom prínosov prinášaných predmetnou zmenou. Pravidlá boli NASESu poskytnuté na separátnom stretnutí.
- Plán práce projektového tímu bol prítomnými členmi RV jednohlasne schválený.

10. Vyjadrenie SIPI k finančnému ukončeniu projektov

- Usmernenie k procesu predkladania žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) s následnou realizáciou rozpočtového procesu - termín predkladania ŽoP - predfinancovanie, zálohová platba - na SIPI je do 05.11.2025, pričom pri predfinancovaní je potrebné mať kladný výsledok z kontroly verejného obstarávania.
- Usmernenie k dátumu úhrady výdavkov v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov – dátum úhrady faktúry – deň vzniku výdavku 30.03.2026. Táto informácia je v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM).

11. Riziká

- Riziká Platformy sú uvedené na snímkach č. 19 – 21 priloženej prezentácie.
- Z úrovne programového riadenia Platformy bolo vyzdvihnuté riziko súvisiace s projektom Slovensko v mobile (ďalej len „SvM“) a s nasadením Inkrementu 4, kde riadenie Platformy eviduje problém so súčinnosťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) a s poskytnutím privátneho SDK (Software Development Kit). Je pripravené dočasné náhradné riešenie s produktovými obmedzeniami bez súčinnosti MV SR. Zástupcovia NASES boli požiadaní o dodanie harmonogramu nasadenia SvM Inkrement 4, nakoľko aj napriek nesúčinnosti MV SR je neustále odkladané nasadenie Inkrementu 4 zo strany NASES, aj keď máme aj malú rozvojovú SLA, ktorá bola obstarávaná pre tieto účely ako aj zmluva na Rozvoj CAMP.

12. Úlohy

- Súbor úloh navrhovaných z úrovne programového riadenia Platformy je uvedený na snímke č. 23 priloženej prezentácie. Úlohy pridelené na predošlom zasadnutí RV sú odpočítované na snímke č. 24 (všetky splnené).
- Súbor úloh uvedený na snímke č. 23 priloženej prezentácie bol prítomnými členmi RV jednohlasne schválený.

13. Rôzne



- Zo strany splnomocnenca zastupujúceho predsedu RV bol podaný návrh na zmenu znenia Štatútu v zložení RV. Navrhuje zastúpenie každej entity (t.j. za MIRRI sa za entitu považuje sekcia) v počte 2 zástupcov. NASES sa v tomto chápaní považuje za 1 entitu ako celok a navrhuje sa zastúpenie v počte 3 osôb. Tiež sa navrhuje zrušenie možnosti online pripájania k zasadnutiam RV.
- Návrhy za jednotlivé sekcie je potrebné dodať do stredy 24.09.2025 12:00 hod.

Rozhodnutia

Číslo R.	Navrhované rozhodnutia	Schválené
R_14/RV_04/2025	RV schvaľuje Plán práce projektového tímu NASES.	ÁNO
R_15/RV_04/2025	RV schvaľuje súbor úloh uvedených v priloženej prezentácii.	ÁNO

Úlohy

Č.	Úloha	Termín	Zodpovedný	Plnenie /status
U_11/RV_04/2025	Definovať Roll out plán nasadzovania komponentov do produkcie v NASES.		NASES	NOVÁ
U_12/RV_04/2025	Predložiť plán a odpočtovať stav zapájania OVM pre životné situácie členom RV na mesačnej báze.		Klára Niko / Radovan Vargic	NOVÁ
U_13/RV_04/2025	Reportovať finálny scope a finančnú alokáciu pre prijímateľa NASES s odôvodnením na členov RV.		NASES	NOVÁ
U_14/RV_04/2025	Odpočtovať stav a harmonogram nasadenia InK4 ako prerekvizity ďalších prác na SvM členom RV.		NASES	NOVÁ
U_15/RV_04/2025	Určiť ďalší postup pre vyriešenie situácie okolo nesúčinnosti MV SR pre produkty v gescii MIRRI a NASES.		ŠT II	NOVÁ
U_16/RV_04/2025	Na základe úlohy z RV ŽS zo dňa 4.9.2025 zabezpečiť vstupy a komplexné informácie pre OVM v súvislosti s ich integráciami na CK a v spolupráci s programom ŽS zabezpečiť ich realizáciu a reportovanie stavu a rizík.		Klára Niko / Radovan Vargic	NOVÁ



U_17/RV_04/2025	Zaujať stanovisko, akým spôsobom sa bude riešiť zabezpečenie prostriedkov zo ŠR na prevádzkové SLA pre projekty MIRRI a NASES.		ŠT II	NOVÁ
U_18/RV_04/2025	Zrealizovať per rollam schvaľovanie Centrálného katalógu biznis požiadaviek.		MIRRI	NOVÁ
U_19/RV_04/2025	Predložiť aktualizovaný centrálny katalóg BP na schvaľovanie per rollam.		MIRRI	NOVÁ

Semaforový status:

NOVÁ/PREBIEHA – plnenie načas a bez problémov	NOVÁ
PREBIEHA – plnenie ohrozuje prekážky	PREBIEHA
POZASTAVENÁ/NESPLNENÁ – nedodržanie termínu plnenia	NESPLNENÁ

Schválenie

Zápis zo stretnutia bol zaslaný všetkým zúčastneným. Pripomienky a návrhy k tomuto zápisu je potrebné vzniesť do **02.10.2025**, po tomto termíne bude tento zápis považovaný za schválený.

Meno	Pripomienka

Finálny zápis zo zasadnutia Riadiaceho výboru podľa článku 7 bodu 3 Štatútu Riadiaceho výboru programu **Slovensko 3.0: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií** podpisuje a schvaľuje **predseda Riadiaceho výboru**.

Meno a Priezvisko	Podpis predsedu
Ing. Radoslav Štefánek Štátny tajomník II.	



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KÓPIA

Číslo záznamu: 074606/2025

PLATFORMA PRE ŽIVOTNÉ SITUÁCIE I1, K17, POO

Riadiaci výbor 22.09.2025

(DIGITÁLNE SLOVENSKO - štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)

22.09.2025

Agenda

1. Zloženie Riadiaceho výboru
2. Sumár rozhodnutí per rollam od ostatného RV
3. KPI Platformy, Aktivity
4. Sprístupnenie platformy – míľnik 176
5. Stav verejných obstarávaní
6. Master plán/Financie
7. Využitie Centrálnych komponentov zo strany OVM
8. Aktualizácia Centrálného katalógu biznis požiadaviek
9. Riziká
10. Vstup za NASES
11. Vyjadrenie SIPI k finančnému ukončeniu projektov
12. Úlohy
13. Rôzne

Platforma pre životné situácie: Zloženie Riadiaceho výboru

Člen RV	Nominácia	Hlasovacie právo
Predseda RV – Štátny tajomník II	Ing. Radoslav Štefánek	ÁNO
Podpredseda riadiaceho výboru	Mgr. Roman Miškovič	ÁNO
Zástupca NASES	Mgr. Jana Molnárová	ÁNO
Zástupca stratégie ITVS	Ing. Otto Szöke	ÁNO
Zástupca NASES za prevádzku	Ing. Michal Ďurajka	ÁNO
Zástupca produktového portfólia	Mgr. Daniela Rojková	NIE
Zástupca SDA	Ing. Anton Jelenčiak	NIE
Zástupca NASES za riadenie projektov	Mgr. Radoslav Vargic	NIE
Zástupca IT architektúry	n/a	NIE
Zástupca dodávateľa	n/a	NIE
Zástupca portfólio manažmentu a programového manažmentu MIRRI	Mgr. Roman Miškovič	NIE
Zástupca implementácie Plánu obnovy a odolnosti	Mgr. Aneta Pekarčíková	NIE
Programový manažér SVK 3.0	Mgr. Roman Bíro	NIE
Programový manažér ŽS	Ing. Mariana Širilová	NIE
Tajomník RV	Ing. Alba María Hernández	NIE
Zástupca projektového portfólia MIRRI	Ing. Jozef Toman	NIE

Zmena u členov s hlasovacím právom: – nové obsadenie funkcie Zástupca stratégie ITVS: Ing. Otto Szöke

Zmena u členov bez hlasovacieho práva: – nová funkcia Zástupca SDA: Ing. Anton Jelenčiak

– nová funkcia Zástupca NASES za riadenie projektov: Mgr. Radoslav Vargic

– nové obsadenie funkcie Programový manažér SVK 3.0: Mgr. Roman Bíro

– nové obsadenie funkcie Programový manažér ŽS: Ing. Mariana Širilová

– nové obsadenie funkcie Zástupca implementácie Plánu obnovy a odolnosti: Mgr. Aneta Pekarčíková

Sumár rozhodnutí per rollam od ostatného RV 1/2

Rozhodnutia RV	Hlasovanie
• RV schválil súťažné podklady pre obstaranie služieb podpory a úprav IS KAV	24.02.2025
• RV schválil súťažné podklady pre obstaranie rozvoja CAMP 2025	24.02.2025
• RV schválil súťažné podklady pre obstaranie centrálneho komponentu eDesk 3.0	10.03.2025
• RV schválil vyhlásenie 3 VO: Interaktívny sprievodca, UX/UI pre Platformu pre životné situácií a Prioritné životné situácie, Súhlas s vyhlásením verejného obstarávania Služby podpory BI Tableau analytických reportov a dashboardov	13.06.2025
• RV schválil vyhlásenie VO na CAMP rozvoj 2025	17.07.2025
• RV schválil vyhlásenie 3 VO: PAP 2.0, obstarávanie expertov pre interné potreby tímu MIRRI pre integrácie SvM (DNS IT Role č. 20), obstarávania expertov pre interné potreby tímu MIRRI pre integrácie SvM (DNS IT Role č. 21)	18.07.2025
• RV schválil vyhlásenie VO CZU	04.08.2025
• RV neschválil vyhlásenie VO CPK	06.08.2025
• RV neschválil Dodatok č.2 k ZoD CNM	11.08.2025
• RV schválil vykonanie všetkých potrebných úkonov v zmysle platných zmluvných podmienok pre projekt OOTS a DI(CSRÚ)	20.08.2025
• RV schválil zmenu projektu Konsolidovaná analytická vrstva 2.0 na Rozvoj Informačného systému Konsolidovaná analytická vrstva (ďalej len „IS KAV“) pre potreby životných situácií a vyhlásenie verejného obstarávania na Rozvoj IS KAV pre potreby životných situácií – Centrálne obstarávanie IT rolí pre IS KAV	22.08.2025
• RV schválil vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku diela Portfólio a profil klienta 2.0	26.08.2025

Sumár rozhodnutí per rollam od ostatného RV 2/2

Hlasovanie	Hlasovanie
• RV schválil vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku diela DWH 2.0 – Data warehouse pre Ústredný portál verejnej správy	05.09.2025
• RV schválil vyhlásenie verejného obstarávania na COP Licencie / Nákup licencií produktu pre Centrálnu orchestračnú platformu pre životné situácie	05.09.2025
• RV schválil projektovú dokumentáciu k projektu Modernizácia Platformy pre rozvoj a riešenie životných situácií	10.09.2025
• RV schválil vyhlásenie verejného obstarávania pre projekt Centrálny podpisový komponent	16.09.2025

Prebiehajúce hlasovania per rollam

Hlasovanie	Hlasovanie od
• Žiadosť o schválenie projektovej dokumentácie Notifikácie v kontexte životných situácií – Centrálny notifikačný modul (CNM) - ukončenie etapy Analýza dizajn a finálne výstupy Etapy	12.09.2025
• Žiadosť o súhlas s vyhlásením verejného obstarávania pre projekt Digitálny onboarding (DO)	12.09.2025

KPI Platformy

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Číslo	Názov míľnika/cieľa	Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov	Termín	Cieľ	Plnenie
174	Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment	Zavádzanie digitálnych riešení pre dve vybrané životné situácie s týmito vlastnosťami: jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb; jednotné miesto pre realizáciu služieb; v prípade potreby mobilná verzia; jednotný dizajn; jasná navigácia; plynulé prechody cez životnú situáciu; prehľad o stave spracovania podania; notifikácia o stave a online platby. Projekt bude zahŕňať integráciu riešení do centrálného portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie obchodných procesov, aby boli ucelené, modernizáciu programových systémov a pripojenie k systémom centrálného middlewaru a centrálného backendu. Implementácia dvoch najpoužívanejších životných situácií.	Q2/2025	2	Splnené
175	Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment	Úplné zavedenie digitálnych riešení pre 16 vybraných životných situácií s týmito vlastnosťami: jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb; jednotné miesto pre realizáciu služieb; v prípade potreby mobilná verzia; jednotný dizajn; jasná navigácia; plynulé prechody cez životnú situáciu; prehľad o stave spracovania podania; notifikácia o stave a online platby. Projekt bude zahŕňať integráciu riešení do centrálného portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie obchodných procesov, aby boli ucelené, modernizáciu programových systémov a pripojenie k systémom centrálného middlewaru a centrálného backendu.	Q2/2026	16	Čiastkové
176	Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií (sprístupnenie)	Modernizácia platformy frontend, backend a middleware (spoločné moduly) založenej na zásadách nízkokódovateľných komponentov, ktoré sú centrálné riadené pre všetkých poskytovateľov verejných služieb. Platforma je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie.	Q2/2025		Splnené súčasť 6.ŽoP

Platforma pre životné situácie - informácia k realizovaným a plánovaným aktivitám

Zrealizované aktivity júl-august 2025	Plánované/prebiehajúce
Formálna kontrola z EK k odpočtu Miľníka 17-6	Vládny audit – SvM, KAV, 2 ŽS - prebiehajú dožiadania
Rokovania s dodávateľom DXC z dôvodu implementácie nevyhnutných požiadaviek na dátové integrácie a rozvoj IS CSRÚ	Simplifikácia cieľov/míľníkov POO - prebieha
Aktualizácia Centrálného katalógu biznis požiadaviek	Odpočet stavu VO na NIKA - následná revízia
	Realizácie stretnutí k delivery CK na OVM – prebieha nastavenie harmonogramov stretnutí
	Požiadavka zo SIREs na NASES ohľadom predstavenia požiadaviek súvisiacich so žiadosťou o navýšenie prostriedkov z POO

Platforma pre životné situácie: Míľnik 176 - Odpočet

KOMPONENT	KATEGÓRIA	NOVÝ/ROZVÍJANÝ KOMPONENT	DÁTUM SPRÍSTUPNENIA/NASADENIA	PRÍNOS
Interaktívny sprievodca	Frontend	Nový	26.04.2024 – preberací protokol (i) (príloha č.18)	- Zjednodušenie prístupu ku komplexným návodom životných situácií - Aktuálnosť informácií a dôveryhodnosť obsahu
eForm Dizajnér	Frontend/ Backend	Nový	03.06.2025 – akceptačný protokol (i) (príloha č.19)	- Úspora finančných prostriedkov OVM - Zvýšenie počtu elektronických služieb - Zníženie chybovosti pri tvorbe formulárov - Zvýšenie samostatnosti OVM cez podporu digitálnej transformácie priamo z vnútra inštitúcií
Podpisovanie mobilom	Frontend	Rozvíjaný	06.05.2025 – záverečný akceptačný protokol (i) (príloha č. 17)	Zjednodušenie podpisovania dokumentov bez potreby použitia čítačky čipových kariet
Dátové integrácie	Middleware	Rozvíjaný/Nový DI	23.04.2025 – akceptačný protokol (i) (príloha č. 25)	- Redukcia polí vo formulároch - Zefektívnenie výmeny údajov medzi OVM - Zefektívnenie procesov OVM v rámci životných situácií
Centrálna API manažment platforma	Middleware	Rozvíjaný	25.02.2025 – akceptačný protokol (i) (príloha č. 20)	Zefektívnenie spolupráce OVM a ich integrácie na centrálné komponenty
Centrálny notifikačný modul	Frontend/ Backend	Nový	23.04.2025 – protokol z vecnej kontroly (i) (príloha č. 21)	- Zvýšenie podielu elektronickej komunikácie štátu s občanom - Zvýšenie počtu zasielaných notifikácií - Jedno riešenie pre zasielanie všetkých typov notifikácií - Sproaktívnenie komunikácie na občana/podnikateľa
Konsolidovaná analytická vrstva	Backend	Rozvíjaný	01.05.2025 – akceptačný protokol (i) (príloha č. 22)	- Zefektívnenie procesov životných situácií - Vytvorenie dashboardov nad životnými situáciami

Plán VO projektov Platformy - aktualizácia k 1.9.2025

Ciele/Míľníky	Nositeľ	Komponent	Termín vyhlásenia VO	Termín zverejnenia Zmluvy	Nasadenie do produkcie
PREREKvizITY	MIRRI	CAMP	január/2025	február/2025	február/2025
	NASES	mÚPVS - govnet			máj/2025
SPRÍSTUPNENIE PLATFORMY (spĺnenie mĺlníka POO)	MIRRI	Interaktívny sprievodca	R1: jún/2025	R1: júl/2025	R0: apríl/2025 R1: september/2025
	NASES	Podpisovanie mobilom	november/2024	marec/2025	máj/2025
	MIRRI	KAV 2.0 - Rozvoj 2025	jún/2025	september/2025	R0: máj/2025 R1: december/2025
	MIRRI	CPDI - dátové integrácie	n/a	n/a	apríl/2025
	NASES	CNM	september/2025	január/2025	R0: marec/2025 R1: február/2026
	MIRRI	CAMP - sprístupnenie	január/2025	február/2025	február/2025
	NASES	eFORM dizajnér	október/2024	apríl/2025	R1: jún/2025 R2: február/2026
ĎALŠÍ ROZVOJ PLATFORMY	NASES	Konštruktor správ	október/2024	apríl/2025	R2: február/2026
	NASES	Lokátor služieb	október/2024	apríl/2025	R2: február/2026
	NASES	CZU	august/2025	september/2025	marec/2026
	NASES	COP	september/2025	september/2025	marec/2026
	NASES	IAM	TBD	TBD	marec/2026
	NASES	PAP 2.0	september/2025	september/2025	február/2026
	NASES	eDESK 3.0	marec/2025	jún/2025	február/2026
	NASES	CEP	apríl/2025	august/2025	január/2026
	MIRRI	SvM - Rozvoj 2025	júl/2025	august/2025	október/2025
	MIRRI	CAMP - Rozvoj 2025	júl/2025	september/2025	december/2025
	MIRRI	Digitálny onboarding	september/2025	október/2025	marec/2026
	MIRRI	IS KAV - rozvoj 2025	august/2025	september/2025	marec/2026
	MIRRI	Mobilná aplikácia	september/2025	december/2025	apríl/2026
	MIRRI	OOTS	n/a	január/2025	marec/2026
	MIRRI	CPDI - rozvoj 2025	n/a	n/a	november/2025
	MIRRI	CPK	september/2025	december/2025	júl/2026

Harmonogram dodávok Platformy- aktualizácia k 1.9.2025

Ciele/Míľniky	Nositeľ	Komponent	DNR/technická špecifikácia	Integračný manuál	Testovacie prostredie	Sprístupnenie v produkcii
SPRÍSTUPNENIE PLATFORMY (splnenie míľnika POO)	MIRRI	Interaktívny sprievodca	september/2025	N/A	september/2025	október/2025
	NASES	Podpisovanie mobilom	N/A	N/A	apríl/25	máj/2025
	MIRRI	IS KAV sprístupnenie	N/A	máj/2025	máj/2025	jún/2025
	MIRRI	Dátové integrácie	N/A	N/A	priebežne	priebežne
	NASES	CNM	R1: apríl/2025 R2: júl/2025	R1: júl/2025 R2: október/2025	R1: marec/2025 R2: august/2025	R1: apríl/2025 R2: december/2025
	MIRRI	CAMP sprístupnenie	január 2025	R0: január/2025 R1: júl/2025	január/2025	február/2025
	NASES	eForm dizajnér	R1: apríl/2025 R2: august 2025	N/A	R1: máj/2025 R2: september/2025	R1: jún/2025 R2: február/2026
ĎALŠÍ ROZVOJ PLATFORMY	NASES	Lokátor	R2: august/2025	november/2025	R2: september/2025	R2: február/2026
	NASES	Konštruktor/Filler	R2: august/2025	november/2025	R2: september/2025	R2: február/2026
	NASES	CZU	september/2025	október/2025	november/2025	marec/2026
	NASES	COP	november/2025	december/2025	december/2025	marec/2026
	MIRRI	CPK	marec/2026	apríl/2026	jún/2026	júl/2026
	NASES	IAM	TBD	TBD	február/2026	marec/2026
	NASES	PAP2.0	október/2025	február/26	december/2025	marec/2026
	NASES	eDesk	september/2025	december/2025	december/2025	február/2026
	NASES	CEP3.0	október/2025	november/2025	december/2025	máj/2026
	NASES	KDS	október/2025	február/26	február/26	marec/2026
	MIRRI	SvM	N/A	N/A	september/2025	november/2025
	MIRRI	DO	september/2025	december/2025	január/2026	marec/2026
	MIRRI	MAM	október/2025	december/2025	február/26	apríl/2026
	MIRRI	IS KAV - rozvoj 2025	december/2025	december/2025	február/26	marec/2026
	MIRRI	OOTS	jún/2025	január/2026	február/2026	marec/2026
	NASES	eIDAS3.0	jún/2025	september/2025	marec/2024	október/2025
	MIRRI	CAMP	január 2025	júl/2025	júl/2025	október/2025

Využitie Centrálnych komponentov zo strany OVM

	DEUS	MD SR	MPSVR SR	MŠVVM SR	MV SR	SP	NCZI	ŠÚ_SR	ŠVPS MPRV SR	ÚGKK	ÚVZ SR
CAMP	8		4	3	7	6				2	
CNM	7		4	2	7	6				2	
COP	6		3			5					
CZU	7		3			6					
Dátové integrácie	3		7	2	1	6			1	1	
eDesk		1									
eForm dizajnér	1		6	3	2	6					
eIDAS3.0		1									
IS KAV 2.0	8		5	3	6	6			1	3	1
Konštruktor/Filler			1								
Lokátor			1								
PAP2.0			2								

Eskalácie a riziká pri dodávkach CK zo strany OVM


OVM, ktoré plánujú využiť CK	Komponent	Problém/Dopad
SP, DEUS, MPSVaR, MV, MŠVVaM	eDizajner	Nepostačujúce funkcionality Diela R1/ vlastné riešenia OVM
Nikto nevyužije okrem MPSVaR	Lokátor/Konštruktör	Neskoré dodanie a riziko aj pre MPSVaR/ vlastné riešenia OVM
SP, MV, DEUS, MŠVVaM, ÚGKK, MPSVaR	CAMP	Závislé na vypublikovaní API ostatných komponentov, časové riziko pre OVM
SP, MV, DEUS, MŠVVaM, ÚGKK, MPSVaR	CNM	R1 CNM nepostačujúci, R2 riziko - čas napojenia OVM / vlastné riešenia OVM
SP, DEUS, MPSVaR	COP/CZU	Do 15.12.potrebný Integrovaný manuál pre SP, inak nevyužije Bude využité len pre malý počet procesov pri DEUS a MPSVaR – riziko pre neskorý termín poskytnutia technickej dokumentácie
SP, DEUS, MPSVaR, MŠVVaM, MV, ÚGKK	DI/CSRÚ	Nejasný čas začiatku realizácie DI cez CSRÚ - problém MIRRI a dodávateľ / veľké ohrozenie prínosov ŽS
Nikto nevyužije okrem MPSVaR	PaP	Neskoré dodanie a riziko aj pre MPSVaR – nedostatok technických informácií/problém pri akceptácii 2 ŽS

Využitie Centrálnych komponentov zo strany OVM


KOMPONENT	POČET OVM	POZNÁMKA
eDesk	1 (MD SR) - doteraz nedoručovali do eDesk	Bez potreby evidovať v Imp ŽS
EIDAS	1 (MD SR)	Bez potreby evidovať v Imp ŽS
IAM	Prierezové	Bez potreby evidovať v Imp ŽS
Rozvoj SvM	Prierezové	Bez potreby evidovať v Imp ŽS
Upgrade súčasného podpisovača na ÚPVS	Prierezové	Bez potreby evidovať v Imp ŽS
Digitálny onboarding	Prierezové a pre účel SvM v rámci POO	Bez potreby evidovať v Imp ŽS
CEP	Prierezové	Nakoľko nebolo zo strany NASES riešenie nastavené aj na zabezpečenie dodania pre OVM v rámci POO, OVM si musia zabezpečiť prostriedky zo ŠR
OOTS	Prierezové	Nakoľko nebolo riešenie nastavené aj na zabezpečenie dodania pre OVM v rámci POO, OVM si musia zabezpečiť prostriedky zo ŠR
MaM	Prierezové	Bez potreby evidovať v Imp ŽS
KDS (SNCA 5.0)	Prierezové	
OPP (Optimalizácia prevádzkovej platformy)	Prierezové	

Finančné riadenie – MIRRI + NASES (POO + ŠR)


Hodnota VO podľa finančného limitu (MIRRI & NASES)

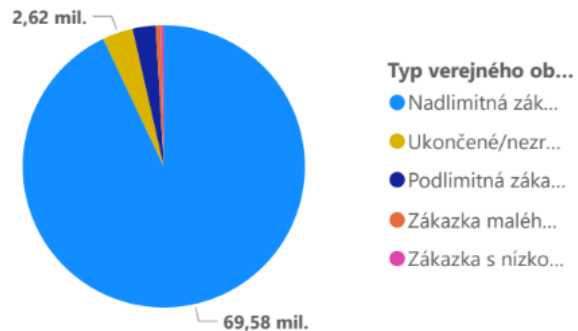


Štruktúra VO podľa finančného limitu (MIRRI & NASES)

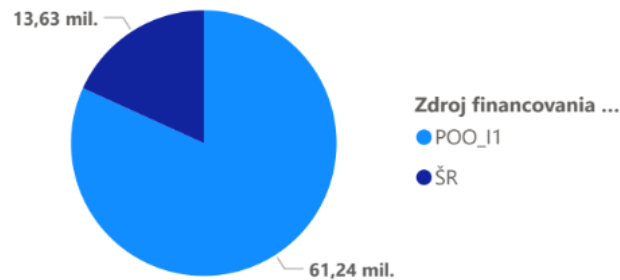


Štruktúra VO podľa finančného limitu (MIRRI & NASES)

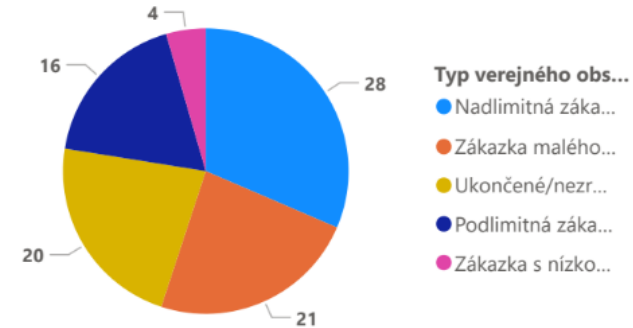

VO podľa stavu rozpracovania (MIRRI & NASES)

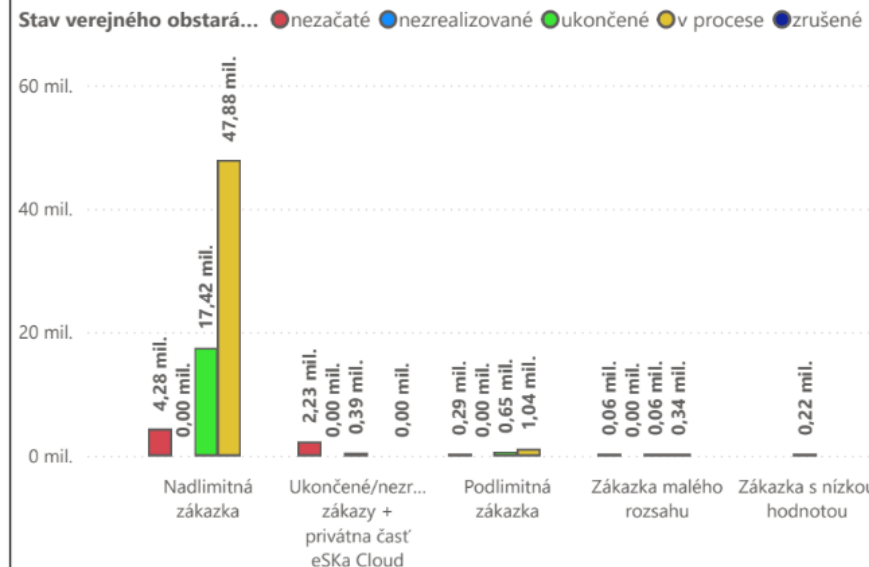


Vývoj výdavkov v súvislosti s implementáciou programu (MIRRI & NASES)

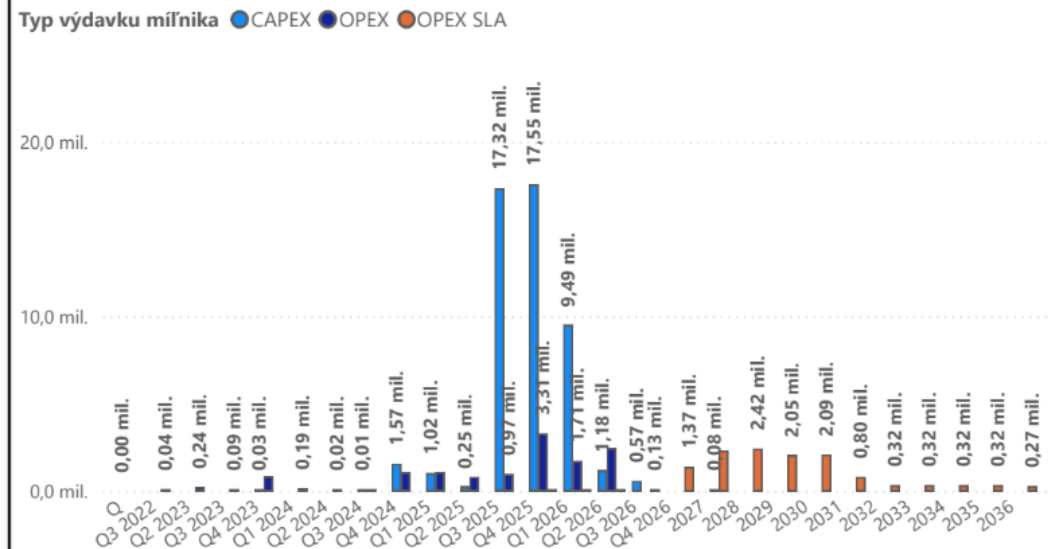


Finančné riadenie – MIRRI (POO + ŠR)


Hodnota VO podľa finančného limitu (MIRRI)

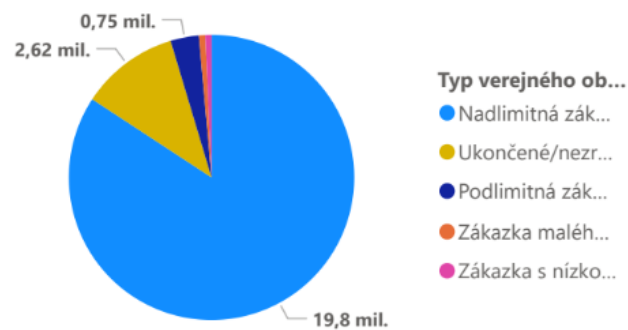

Štruktúra VO podľa finančného limitu (MIRRI)

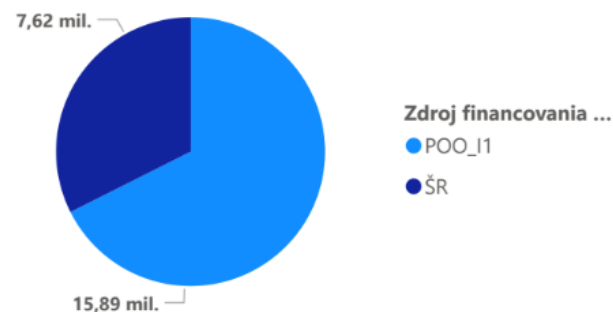


Štruktúra VO podľa finančného limitu (MIRRI)

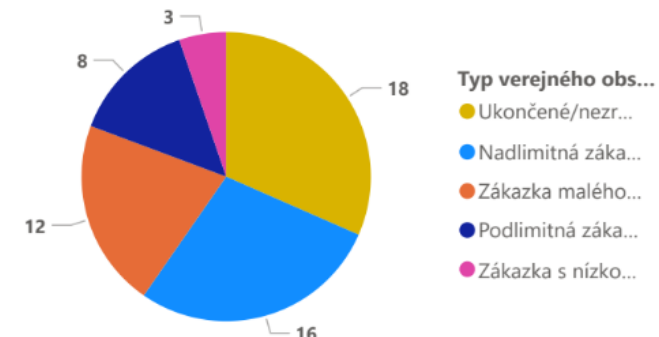


VO podľa stavu rozpracovania (MIRRI)

Stav verejného obstará... ● nezačaté ● nezrealizované ● ukončené ● v procese

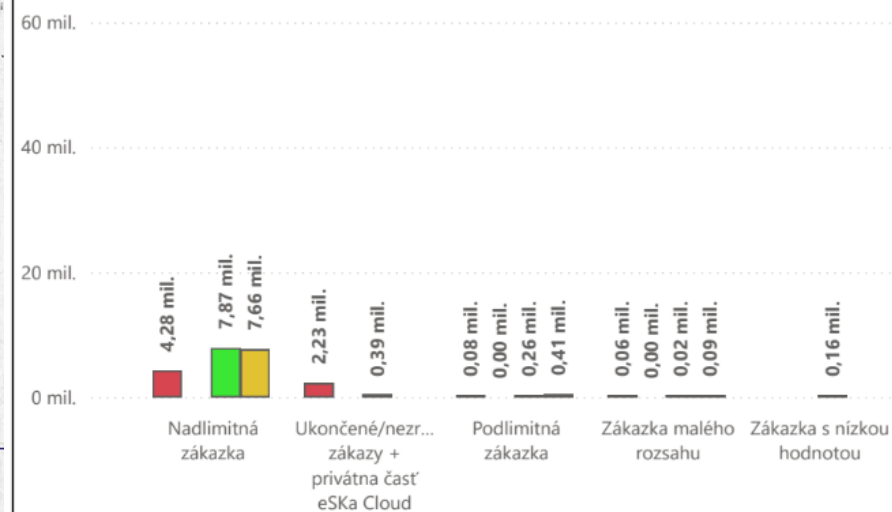


Vývoj výdavkov v súvislosti s implementáciou programu (MIRRI)

Typ výdavku mílnika ● CAPEX ● OPEX ● OPEX SLA

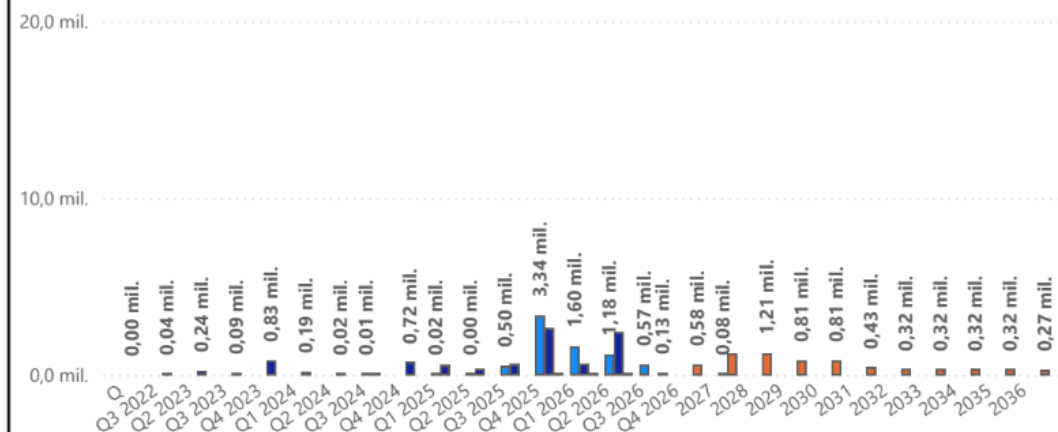


Finančné riadenie – NASES (POO + ŠR)


Hodnota VO podľa finančného limitu (NASES)

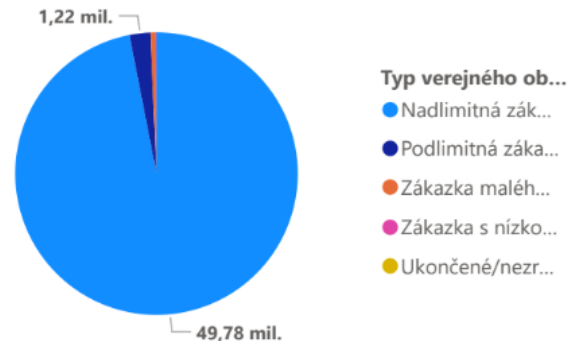

Štruktúra VO podľa finančného limitu (NASES)

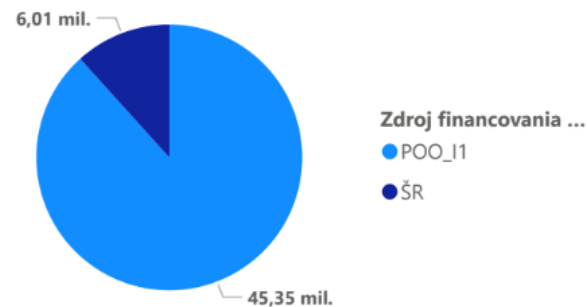


Štruktúra VO podľa finančného limitu (NASES)

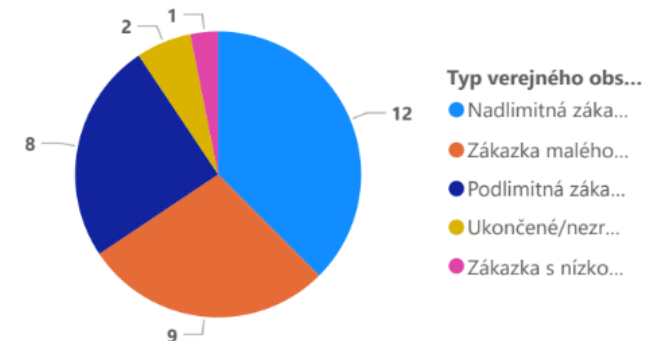


VO podľa stavu rozpracovania (NASES)

Stav verejného obstará... ● nezačaté ● nezrealizované ● ukončené ● v procese ● zrušené

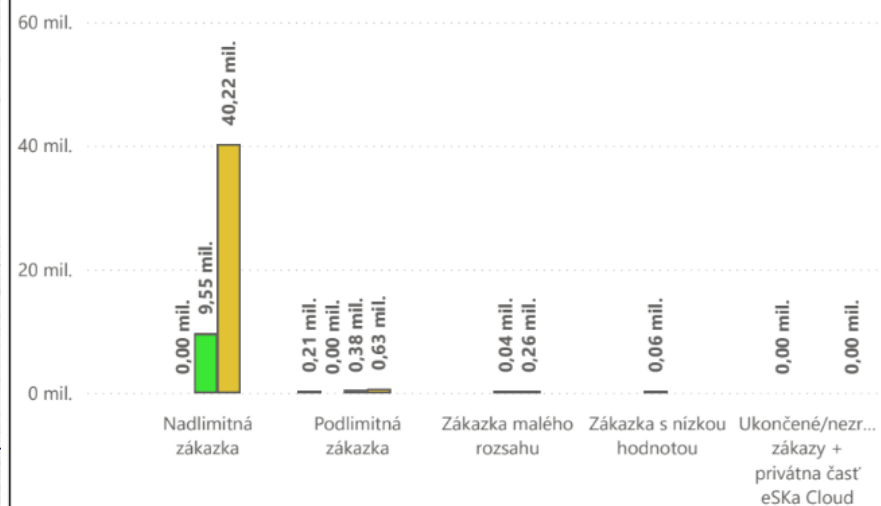

Vývoj výdavkov v súvislosti s implementáciou programu (NASES)

Typ výdavku míľníka ● CAPEX ● OPEX ● OPEX SLA

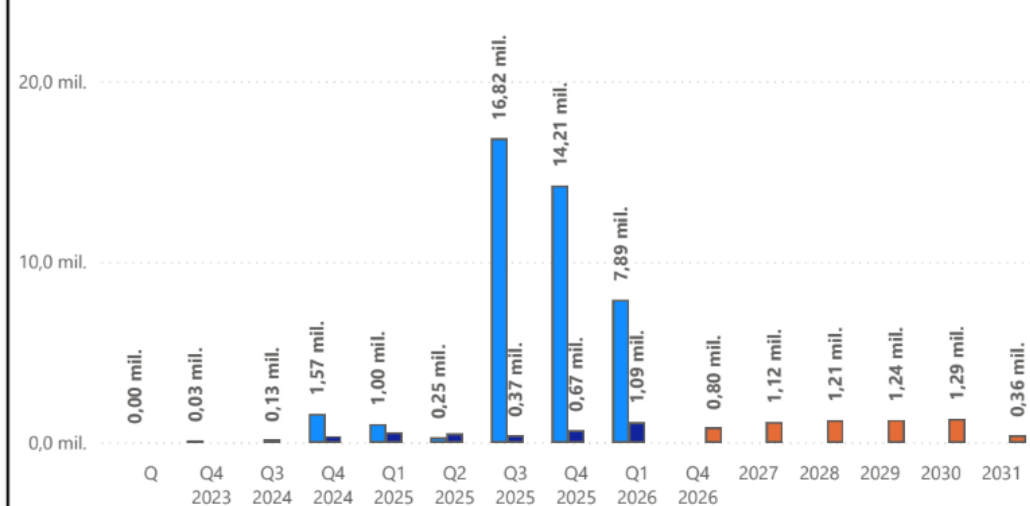

Aktualizácia Centrálného katalógu biznis požiadaviek – informácia pre členov RV

Katalóg: v gescii MIRRI, stav k 9.9.2025

Link: [Centralny katalogBP Platforma.xlsx](#)

Zmeny:

- Aktualizácia biznis požiadaviek z dôvodu zmien v scope jednotlivých projektov Platformy
- Doplnenie požiadaviek pre Optimalizáciu prevádzkovej platformy NASES
- Optimalizácia údajov v katalógu vrátane previazania na oblasti reflektujúce definície v míľnikoch a cieľoch pre I1 K17 POO (využitie pri odpočtovaní na EK a vytváraní Súhrnných dokumentov)
- Návrh na vylúčenie Mobilnej aplikácie vzhľadom na nerealizovateľnosť v termínoch POO

Vstupy za NASES

Predkladáme na schválenie Riadiacemu výboru dokumenty v zmysle Usmernenia č. 1/2025:

Plán práce projektového tímu

Rozpis jednotlivých pozícií projektového tímu NASES v členení na jednotlivé fázy projektu s popisom predpokladaných činností.

Produktový zoznam požiadaviek

1. Aktualizácia biznis požiadaviek z dôvodu zmien v scope jednotlivých projektov Platformy
2. Doplnenie požiadaviek pre Optimalizáciu prevádzkovej platformy
3. Navýšenie potrebného finančného krytia o sumu 24.189.193,06 bez DPH

Programové riziká a eskalácie 1/3

Riziko/eskalácia	Popis	Mitigácia
Nesúlad dodávok so Zmluvou o PPM a projektovou dokumentáciou NASES	Nedodávame riešenia v zmysle Zmluvy a zámeru, UHP vyjadrilo už v tomto stave pochybnosti o hospodárnosti riešení	Nenavyšovanie prostriedkov pre NASES, dôraz na kroky k napájaniu OVM
Ohrozenie dodávky projektov v rámci programového obdobia POO	Realizované projekty sú v omeškaní, riziko ich pozastavenia po revízii NIKA	Zaslanie odôvodnenia a informácie o skutkovom stave NIKA
Nevyužitelnosť centrálnych komponentov životnými situáciami vzhľadom na neskorý termín dodania	- ŽS nestíhajú využiť CK vzhľadom na neskoré dodávky projektov - Riešenia nemajú funkcionality, ktoré OVM potrebujú - Problém odôvodnenia potreby riešení dodávaných v Platfome pre ŽS voči EK - Navýšenie potrebných finančných prostriedkov namiesto úspory vďaka centrálnym komponentom, nakoľko OVM musia financovať alternatívne riešenia	Potrebná diskusia s OVM a finálne zadefinovanie zoznamu využitých komponentov jednotlivými OVM, definovanie rollout plánov
Celková hodnota projektov v gescii NASES prevyšuje rámec priameho vyzvania	Navýšenie odhadovanej hodnoty projektov oproti priamemu vyzvaniu o 22,943 mil. EUR v zmysle údajov doplnených po auguste 2025	Transparentná komunikácia a vecné odôvodnenie navýšení, spustenie procesov formalizácie ak je navýšenie potrebné a realizovateľné v čase POO
Legislatívna zmena zákona o ITVS 95/2019 Z.z. - predpoklad účinnosti až 1.3.2026	Novela zákona kľúčová pre projekt KAV – bez novely nemá MIRRI právo spracovávať osobné údaje v súvislosti s monitoringom a zberom spätnej väzby a neprikazuje OVM zasielať dáta automatizovane. Bez účinného zákona OVM nedajú MIRRI ostré dáta a nenaplnia biznis požiadavky s týmto spojené a MIRRI bude zbierať dáta manuálne, čo je kapacitne náročné	Prebiehajúce rozporové konania, priorita uzatvoriť dohodu s OVM a posunúť zákon ďalej v legislatívnom procese

Programové riziká a eskalácie 2/3

Riziko/eskalácia	Popis	Mitigácia
Nesúčinnosť MV SR	Potrebná súčinnosť MV SR pri: eIDAS (odstránenie problémov s RFO), SvM (SDK), DO (validácia OP), KAV (neochota poskytovať akékoľvek dáta)	Potreba stretnutia na úrovni vedenia MIRRI a MV SR - úroveň ŠTII
Predlžovanie obstarania kontajnerizačnej a virtualizačnej platformy	Ochromenie schopnosti nasadzovania nových modulov. Stará KVP na Oracle PCA má svoje technologické a výkonostné limity a na integráciu nebude stačiť; slúži len ako dočasná možnosť.	Informuje NASES
Nedostatočná transformácia NASESu z prevádzkovateľa na integrátora a nedostatočné rozvinutie oddelenia DevSecOps s podporou L2	DevSecOpsový prístup pri nasadzovaní sa obmedzí len na spôsob nasadzovania aplikácií na KVP a samotné nasadzovanie bude zdĺhavý proces komunikácie medzi "starými" a "novými" oddeleniami. To ohrozí termíny dodávok. Nedostatočný nábor a integrácia ľudských zdrojov L2 do DevSecOps paralyzuje schopnosť poskytovania L2 pre nové moduly.	Informuje NASES

Programové riziká a eskalácie - 3/3

Riziko/eskalácia	Popis	Mitigácia
Nevyriešené problémy minulých projektov, prenášajúce sa do Programu	Slovensko v mobile: 1. nasadenie InK 4 2. súčinnosť MV SR pre poskytnutie privátneho SDK	- Využitie existujúcich SLA zmlúv pre SvM, ktoré boli realizované pre účely sanácie problémov s InK4 Z:NASES - Stretnutie s MV SR na úrovni ŠTII
Nevyriešené problémy minulých projektov, prenášajúce sa do Programu	Dátové integrácie a OOTS – nekoncepčná komunikácia na dodávateľa DXC, nesprávne nastavené vzťahy z minulosti	Zrealizovaná sada stretnutí s dodávateľom, schválenie objednania prác riadiacim výborom, urgencie a jasná komunikácia postavenia MIRRI smerom na dodávateľa v zmysle platnej zmluvy, finálne zaslanie požiadaviek na nacenenie v kontexte celého balíka potrebných prác
Vzťahy MIRRI a NASES	- Netransparentná komunikácia prijímateľa NASES smerom k vecnej sekcii v oblasti požiadaviek na navyšovanie zdrojov poskytnutých z POO - Nesúlad riešení so Zmluvou o PPM	- Prinášanie zámerov na úpravy riešení na otvorené platformy riadenia - produktové a projektové statusy, produktová komisia - Otvorená komunikácia problémov a požiadaviek bez rozhodnutí jednotlivcami - Rešpektovanie postavenia MIRRI a vecnej sekcie z pohľadu produktového a programového riadenia
Náklady na prevádzku systémov a riešení dodávaných v rámci POO	- Nedostatočné pokrytie zdrojmi ŠR pre už schválené riešenia - Neriešenie zdrojov na pokrytie SLA POO pri novom balíku požiadaviek na navyšovanie	- Jasné vyčíslenie dopadov na ŠR a definovanie krokov k zabezpečeniu týchto zdrojov - Zodpovedný prístup pri návrhoch na navyšovanie s ohľadom na dopad na budúce obdobie – financie na pokrytie prevádzkových SLA

Proces žiadostí o platbu a úhrada výdavkov

1. Usmernenie k procesu predkladania žiadostí o platbu a následnej realizácii rozpočtového procesu

- ŽoP
- DPH

2. Usmernenie k dátumu úhrady výdavkov v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov

- Dátum úhrady FA – deň vzniku výdavku 30.3.2026

Úlohy

RV ukladá úlohu:	Zodpovedný	Termín
• Definovať Roll out plán nasadzovania komponentov do produkcie v NASES	NASES	
• Predložiť plán a odpočtovať stav zapájania OVM pre ŽS členom RV na mesačnej báze	Klára Niko/Radovan Vargic	
• Reportovať finálny scope a finančnú alokáciu pre prijímateľa NASES s odôvodnením na členov RV	NASES	
• Odpočtovať stav a harmonogram nasadenia InK4 ako prerekvizity ďalších prác na SvM členom RV	NASES	
• Určiť ďalší postup pre vyriešenie situácie okolo nesúčinnosti MV SR pre produkty v gescii MIRRI a NASES	ŠT II	
• Na základe úlohy z RV ŽS zo dňa 4.9.2025 zabezpečiť vstupy a komplexné informácie pre OVM v súvislosti s ich integráciami na CK a v spolupráci s programom ŽS zabezpečiť ich realizáciu a reportovanie stavu a rizík	Klára Niko/Radovan Vargic	
• Zaujať stanovisko, akým spôsobom sa bude riešiť zabezpečenie prostriedkov zo ŠR na prevádzkové SLA pre projekty MIRRI a NASES	ŠTII	
• Zrealizovať per rollam schvaľovanie Centrálného katalógu biznis požiadaviek	MIRRI	
• Predložiť aktualizovaný centrálny katalóg BP na schvaľovanie per rollam	MIRRI	

Úlohy z RV – Odpočet

Úlohy	Zodpovedný/Termín	Odpočet
• RV ukladá projektom povinnosť pri predkladaní dokumentácie k schváleniu VO na RV dodať súčasne plán realizácie projektu s garanciou realizovateľnosti v rámci oprávneného obdobia POO	Projekty/priebežne	Splnené
• RV ukladá úlohu pripraviť plán sprístupnenia centrálného komponentu pre OVM implementujúce životné situácie	Projekt DLK/ 14.2.2025	Splnené
• RV ukladá úlohu dodať harmonogram implementácie zmenových požiadaviek na súčasné komponenty	NASES/31.1.2025	Splnené
• RV ukladá úlohu dodať harmonogram optimalizácie prevádzkovej infraštruktúry a zabezpečiť priebežné odpočtovanie stavu na programovej úrovni	NASES/31.1.2025	Splnené
• RV ukladá zdefinovať štruktúru súhrnného dokumentu a návrh dôkazov k preukázaniu implementácie Platformy	Roman Miškovič/ 15.2.2025	Splnené



PLÁN [OBNOVY]

cestovná
mapa k lepšiemu
Slovensku



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]

BackUp

KÓPIA
Číslo záznamu: 074606/2025

Informácie k jednotlivým projektom v programoch Platformy pre životné situácie

Platforma – Sprístupnenie – naplnenie míľníka 176

KÓPIA

Číslo záznamu: 074606/2025

Sprístupnenie

DLK – eFORM dizajnér	R1: 03.06.2025
M. Patráš / M. Kulašik	NASES

- Nízkokódovateľný nástroj pre jednoduché vytváranie elektronických formulárov pre potreby štátnej a verejnej správy
- Release 1 obsahuje sprístupnenie pre vytváranie základných formulárov
- Sprístupnenie neobmedzených licencií bez dodatočných nákladov na počet používateľov
- Registrovateľný balíček v MEF, využiteľný na ÚPVs, mÚPVs a špecializovaných portáloch

Podpisovanie mobilom	06.05.2025
M. Patráš / J. Horník	NASES

- Podpisovanie bez použitia čítačky občianskych preukazov pomocou mobilného zariadenia s technológiou NFC
- Implementácia Disig QES Portal bridge API v prostredí SNCA

CNM – Centrálny notifikačný modul	R1: 23.04.2025
E. Hara / P. Marman	NASES

- Jednotný komunikačný kanál pre OVM
- Podporované typy zasielaných notifikácií sú email a správa do elektronickej schránky (Release 2 – rozšírenie typov)
- Modul je dostupný zo siete GOVNET s priradenou rolou voči OVM
- Zaslanie notifikácie pre riaditeľov škôl s výzvou na zanechanie spätnej väzby na nový proces prihlasovania

CAMP – Centrálna API manažment platforma	25.02.2025
V. Kováč / L. Bžochová	NASES

- Úprava internej autentizácie
- Zvýšená úroveň bezpečnosti
- Úprava stránok internej evidencie
- Komplexná používateľská príručka pre OVM
- Jednoduchšia registrácia organizácie zo strany štatutárneho zástupcu
- Naplnenie zákonnej povinnosti definovanej v § 25 ods. 7, z. 305/2013: sprístupniť orgánom riadenia platformu pre publikovanie služieb cez Open API

IS – Interaktívny sprievodca	26.04.2024
K. Gálová / P. Šramko	MIRRI

- Nový komponent s personalizovanými návodmi a rozhodovacím stromom
- Open source Drupal CMS
- Návodov nerozlišujú pod ktorú inštitúcia agenda spadá, ale pozerajú sa na životné situácie ako celok
- Aktuálne vytvorených 8 návodov - 5 životných situácií

KAV – Konsolidovaná Analytická vrstva	01.05.2025
L. Gabaj / P. Semjan	MIRRI

- Monitoring a zber spätnej väzby pre elektronické služby, informačný obsah s cieľom ich neustáleho vylepšovania
- 3 typy dát - z informačných a agendových systémov, Google analytics a spätnej väzby
- Odklon od analytiky jednotlivých podaní k analytike naprieč OVM a ich agendy
- Ostré dáta z prvých dvoch životných situácií - Materská a Základná škola

CPDI – Dátové integrácie	23.04.2025
p. Mihalech, J. Macák / M. Kováč	MIRRI

- Rozšírenie existujúcich a vytvorenie nových dátových integrácií (integračných väzieb) prostredníctvom IS Centrálna platforma dátových integrácií
- 8 integračných väzieb na informačné systémy OVM (120 väzieb)
- Rozšírenie dostupných objektov evidencie na IS CPDI o 1 nový objekt evidencie (3 nové OE)
- 3 zapojené OVM (6 zapojených OVM)

DLK - eFORM dizajnér R2: 02/2026 M. Patráš / M. Kulašik NASES • VO - 0,169M Eur z celkových 1.916 430 Eur s DPH na DLK • dodávateľ poslal (podľa plánu) 31.7.2025 dokumentáciu k DNR R2 na pripomienkovanie, k 27.8. poslal dodávateľ finálne výstupy. Aktuálne sumarizujeme výhrady. • V priebehu nasledujúceho týždňa predložíme RV na schválenie akceptáciu výstupov etapy A&D s výhradou	CPK – Centrálny Podpisový Komponent 07/2026 M. Patráš / P. Šramko MIRRI • VO – 2 M Eur • VO neprešlo schvalovaním na RV 6.8.2025– prebehla úprava ZoD a ZoP – pripravuje sa nové schvaľovanie na RV -vyhlásenie novej PHZ II 15.8.2025 - suma 4 279 966,67 Euro bez DPH – dielo+5 r.SLA + 5r opcia -nový RV a VO do 15.9.2025	eDESK - Elektronická schránka 31.3.26 E. Hara / M. Kulašik NASES • VO - 3,3 M Eur • dodávateľ predložil (podľa plánu) 27.8.2025 dokumentáciu k DNR na pripomienkovanie, aktuálne prebieha pripomienkovanie garantmi do 8.9.	SNCA 31.3.26 M. Paulovič/A. Agócs / J. Horník NASES • VO - 7 M Eur • VO zrušené 11.8.2025 - prebieha rozhodnutie o nastavení ďalšieho postupu	
IS- Interaktívny sprievodca 31.3.26 K. Gálová / P. Šramko MIRRI • PRK - Zákazka malého rozsahu • 7.7.2025 vyhlásenie víťaza a žiadosť o podpis zmluvy Blume Software s.r.o. • podpísaná zmluva zo strany dodávateľa doručená dňa 14.7.2025 • predpoklad podpisu zmluvy ministrom 12.9.2025 • kick-off s dodávateľom 6.8.2025	SvM - Slovensko v Mobile 31.3.26 J. Chovanec/ P. Šimo MIRRI • DNS – 0,95 M Eur • Eskalácia na MV pre nesúčinnosť s dodávkou SDK • ARB 5.8. riešila integráciu na APIGW CAMPu • veľká SLA - stretnutie NASES a MIRRI - uchopenie - 3 stranná zmluva - definovať rozvojové požiadavky • Vyhodnotenie výziev pre DNS role - vyhlásenie víťaza - ŠTART práce	DO – Digitálny Onboarding 31.3.26 J. Chovanec / P. Šimo MIRRI • VO - 0.9 M Eur • Prebieha proces prípravy VO (projektový zámer, prístup k projektu, katalóg požiadaviek, BC/CBA, OPZ, zmluva, SLA, ideový zámer) • Vyhlásenie VO v omeškaní • ZoD vo finálnom pripomienkovaní - následne VO spustenie	MAM – Mobilná Aplikácia MIRRI 31.3.26 J. Chovanec / P. Šimo MIRRI • VO – 0,9 M Eur • Prebieha proces príprava VO (príprava zmluvy, príprava SLA, vypracovanie OPZ, interné pripomienkovanie) • Vyhlásenie VO v omeškaní • Projekt je aktuálne pozastavený	PAP - Profil a portfólio klienta 1.4.26 E. Hara / K. Smetana NASES • VO - POO 214 666,70EUR • Vzhľadom na termíny SVK 3.0, bola odstránená nice to have funkčnosť • Ukončená PHZ č. 2 (must have funkčnosť bez podpory prevádzky), súťaž bude podlimitná zákazka • RV SVK30 MIRRI schválil VO • VO bolo vyhlásené - lehota na predkladanie ponúk 10.09.2025

Platforma – Middleware a Backend

KÓPIA

Middleware

CAMP - Centrálna API manažment platforma

30.1.26

V. Kováč / L. Bžochová

MIRRI

- VO - 0.14 M Eur
- VO na Malý rozvoj CAMP bolo ukončené, pripravuje sa podpis zmluvy s úspešným uchádzačom
- Nadlimitná zákazka na prevádzku CAMP – zmluva bola podpísaná 18.8. - platnosť 10 mesiacov
- Beží penetračné testovanie (CIRT MIRRI)



DLK - Lokátor služieb, Konštruktor správ

31.3.26

Ľ. Tóthová, E. Hara / M. Kulašík

NASES

- VO - 2.1 M Eur (vrátane Dizajnéra)
- dodávateľ poslal (podľa plánu) 31.7.2025 dokumentáciu k DNR R2 na pripomienkovanie, k 27.8. poslal dodávateľ finálne výstupy. Aktuálne sumarizujeme výhrady. V priebehu nasledujúceho týždňa predložíme RV na schválenie akceptáciu výstupov etapy A&D s výhradou



CPDI - Centrálna platforma pre dátové integrácie

31.3.26

P. Mihalech. J. Macák / M. Kováč

MIRRI

- VO - 8 M Eur
- Zasláné Rozvojové požiadavky na dodávateľa DXC:
- Integrácie ŽS - (86 väzieb)
- Zmena integrácie existujúceho poskytovateľa - 16
- Zmena integrácie existujúceho konzumenta - 70
- Technologický upgrade prostredia Talend a migrácia serverov
- Zjednotenie IAM, Web prístup, obslužná zóna



COP-CZU -Centrálna orchestračná platforma, Centrálna zbernica udalostí

31.3.26

Ľ. Tóthová / J. Koža

NASES

- 4 VO v sume 1,724 M Eur
- CZU licencie (kafka) - schválili sme použitie free licencie bez nutnosti VO na platené licencie
- VO na CZU implementačné služby – DDL na ponuky bol 26.8. prebieha vyhodnotenie VO
- VO na COP licencie – prebieha schvaľovanie VO na RV MIRRI s DDL 5.9.
- VO na COP implementačné služby - OPZ je pripravené až na doplnenie technológie, ktorá bude vysúfažená vo VO na COP licencie



OOTS - Once only technical system

31.3.26

M. Paulovič / I. Vyhliadal

MIRRI

- VO v sume 2,570 M Eur
- Zapracovanie pripomienok k DNR, BP a Plán testov: 17.7.2025 – 30.7.2025;
- Získavanie spätnej väzby o úprave IS na strane OVM a vyvolaných nákladoch-priebežne;
- Rozhodnutie Programu alebo RV Programu SVK 3.0 alebo vedenia MIRRI o eskalovanom probléme "Integrácia OOTS na konštruktor správ ÚPVS" na základe stanoviska architektúry
- II. Kolo pripomienkovania DNR, BP a Plán testov do 13.8.2025



Backend

CNM - Centrálny Notifikačný Modul

R2: 31.3.26

E.Hara / J. Horník

NASES

- VO – 0,191 M Eur
- R1 (kritická cesta): nasadený v ostrej prevádzke k 8.4.2025
- R2: Akceptácia etapy Analýza a dizajn na RV projektu a spustenie etapy Implementácia a testovanie 22.8.2025

R2



KAV - Konsolidovaná analytická vrstva

31.3.26

Ľ. Gabaj/ P. Semjan

MIRRI

- VO – 7,709 M Eur
- Na integráciu prioritných OVM potrebujeme vypísanie podlimitnej SLA - čakáme na súhlas RV s podkladmi a nomináciu 3 subjektov na oslovenie
- Potrebná súčinnosť s CPDI – zakomponovanie biznis požiadaviek do rozvojového rámca CPDI



CEP - Centrálna elektronická podateľňa

31.3.26

M. Patráš / Š. Szilva / J. Koža

NASES

- VO – 1,769 M Eur
- 3.9. prebehol Kick off meeting s dodávateľom brainit.sk
- pripravujeme alternatívy k zaobstaraniu HSM a SAM pre projekt CEP 3.0 – primárne zápožička z SNCA
- Riziko s končiacou licenciou 20.5.2026 – nový CEP 3.0 musí byť dodaný a certifikovaný do tejto doby



IAM - Identity and Access management

31.3.26

M. Paulovič / K. Smetana

NASES

- VO – 4 M Eur
- Podklady boli vecne uzavreté k 27.8.
- Prebiehajú úvodné rokovania v rámci PRK



eIDAS - Stotožňovanie cudzincov (eIDAS3 okr. 2)

31.3.26

M. Pavlovič / K. Smetana

NASES

- VO – 0,141 M Eur
- Prebieha proces schvaľovania diela za etapu a ukončenie a akceptácia etapy IaT s výhradou
- Výhrada - pre problémy na strane opráv chýb MV SR.
- Túto skutočnosť je potrebné eskalovať na programovú úroveň, keďže do ukončenia projektu máme 2 mesiace a uvedený stav sa MV SR stále nepodarilo napraviť.



Legenda k indikátoru pokroku :



- Verejné Obstaranie
- Analýza
- Implementácia a testovanie
- Nasadenie a Spustenie

V procese

Ukončené

31.3.26

Indikátor stavu a termín spustenia

Projekt Zavedenia DevSecOps



- Verejné Obstaranie
- Analýza
- Implementácia a testovanie
- Nasadenie a Spustenie

V procese

Ukončené

15.2.25

Indikátor stavu a termín spustenia

L2 a prevádzka

Číslo záznamu 15.2.26

Vytvorenie produktových tímov

15.2.26

Radovan Vargic - Michal Durajka

- Potrebná dohoda medzi sekčnými riaditeľmi a potreba zladenia konceptu zavedenia a formy L2 – aplikačnej a infraštruktúrnej, **prípravuje sa org zmena**

Procesná zmena a organizačná zmena

Radovan Vargic - Michal Durajka

- Potrebná dohoda medzi sekčnými riaditeľmi,
- Potreba zladenia konceptu zavedenia a formy procesnej a organizačnej zmeny pre potreby zavedenia DevSecOps , **prípravuje sa org zmena**

DevSecOps – procesy a interná metodika

Pavol Kantorek

30.9.25

- Prebehli interné stretnutia k oboznámeniu s nástrojmi a postupmi v rámci DevSecOps (odbor integrácie), analytici oboznámení s logovacím nástrojom Kibana
- Pripravujeme/prebieha analýza existujúcich prevádzkových smerníc, metodík a ich zladenie s DevSecOps procesov
- Plánujeme komplexný monitoring

GITLAB – ci/cd automatizácia

Rado Šurina / Pavol Kantorek

30.9.25

- **Vyhlasujeme nové VO s cieľom zabezpečiť od 1.10. do 31.12.26 100 licencií Gitlab Ultimate.**
- Plánujeme preverenie a dokonfigurovanie na HA a zavedenie do prevádzky
- Pripravujeme (po nainštalovaní OpenShiftu) prehodenie GitLabu z Hyperflex na PCA

Prostredia – vytvorenie automatizovaného prostredia v PCA pre nasadzovanie modulov SVK30

Pavol Kantorek

30.09.25

- Prebieha automatizácia a vylepšovanie súvisiacich komponentov prostredia (Monitoring, logovaním siete, DNS servre, KeyClock, backup secretov z Vaultu)
- Pracujeme na stabilizácii DEV, TEST a PROD
- DEV prostredie je vytvorené
- Pripravujeme vytvoriť UAT prostredie
- Pripravujeme opensource OpenShift Lic na PCA prostredie
- **Prebehol upgrade PCA20 na v3.11.1 - done**

apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Automatizované prostredia		Stabilizácia, Tvorba DEV	Rozvoj Prostredia Tooling, PREPROD							
GitLab a ci/cd		Zavedenie a stabilizácia GitLab platformy pre DevSecOps								
DevSecOps procesy a metodiky		Definovanie metodiky	Zavádzanie do prevádzky							
Zavedenie resource managementu		Zavedenie Resource Managementu		Procesná a Organizačná Zmena						
Zavedenie L2		Fáza 1 – Príprava a návrh riešení	Fáza 2 – Implementácia a nastavenie L2 tímu	Fáza 3 – Prevádzka a optimalizácia						

ID	Projekt	Popis rizika	Závažnosť	Stav	Rieši	Spôsob predchádzania rizika alebo manažovania dopadov
1.	Procesná zmena a organizačná zmena	Chýbajúci ľudia na plné zavedenie DevSecOps	Stredná	To be done	Sekčn riaditelia	

Projekty Optimalizácie Prevádzkovej Platformy

KÓPIA
Číslo záznamu

Kategória 1

PCA - Zavedenie PCA do produkcie

30.9.25

Rado Surina / Pavol Kantorek

- Prebieha Objednávka káblov a HW interných prepojení medzi PCA jednotkami pre native DR.
- Upgrade PCA20 úspešne zrealizovaný
- následne plán na upgrade PCA 10, 11, 21
- DEV prostredie vytvorené
- **Plánuje sa príprava presunu PCA 11 do nového DC (nové DC v riešení)**

ZOSP - Kontajnerizačná a virtualizačná platforma

31.3.26

Karol Flak/ Simona Mazúch

- Obstaranie platformy (SW+HW) očakávané do 30.09.25
- čakáme na špecifikáciu 3 firiem pre PHZ a schválenie spustenia PHZ.**
- Uvedenie do prevádzky - do 16.10.25
- Operačná akceptácia Q1 26
- Konfigurácia pre potreby NASES - do 31.3.26

ACOS - Aktualizácia Cloud Object Storage

30.5.25

Rado Surina / Rado Surina

- Projekt dokončený, ostáva realizovať nasledovné aktivity:
- Prebehlo odkonfigurovanie LAN portov na LAN switchi, následné odkablovanie a vymontovanie pôvodného storage z racku
- Prebehlo odkonfigurovanie SAN portov na SAN switchi a následné odkablovanie
- **prebehlo 90% odkablovania – 100% do 30.8**

Zriadenie tretieho dátového centra

15.2.26

Andrej Kmeť / Andrej Kmeť


- Prebieha interná prípravná fáza v NASES - definovanie rozsahu a požiadaviek projektu tretieho dátového centra - done
- Bola vykonaná príprava materiálov a podkladov pre oslovenie trhu a VO (Andrej Kmeť)
- **Očakávame menežerské rozhodnutie o finálnej lokalite DC**

DC LAN - DC LAN - spustenie SDN a doplnenie SW/HW

15.2.26

Andrej Kmeť / Andrej Kmeť

- **Pracuje sa na dizajnovnej fáze projektu SDN (predpokladaná dĺžka 3-4 mesiace) - ukončenie do 30.12**
- tvoríme detailný návrh fungovania-design SDN v prostredí dátových centier, špecifikáciu integrácie s Govnetom ("Govnet 4"), detailný migračný plán pre prechod na SDN infraštruktúru a návrh riešenia pre prepojenie PCA lokalít k ÚPVS prostredníctvom novej SDN infraštruktúry.

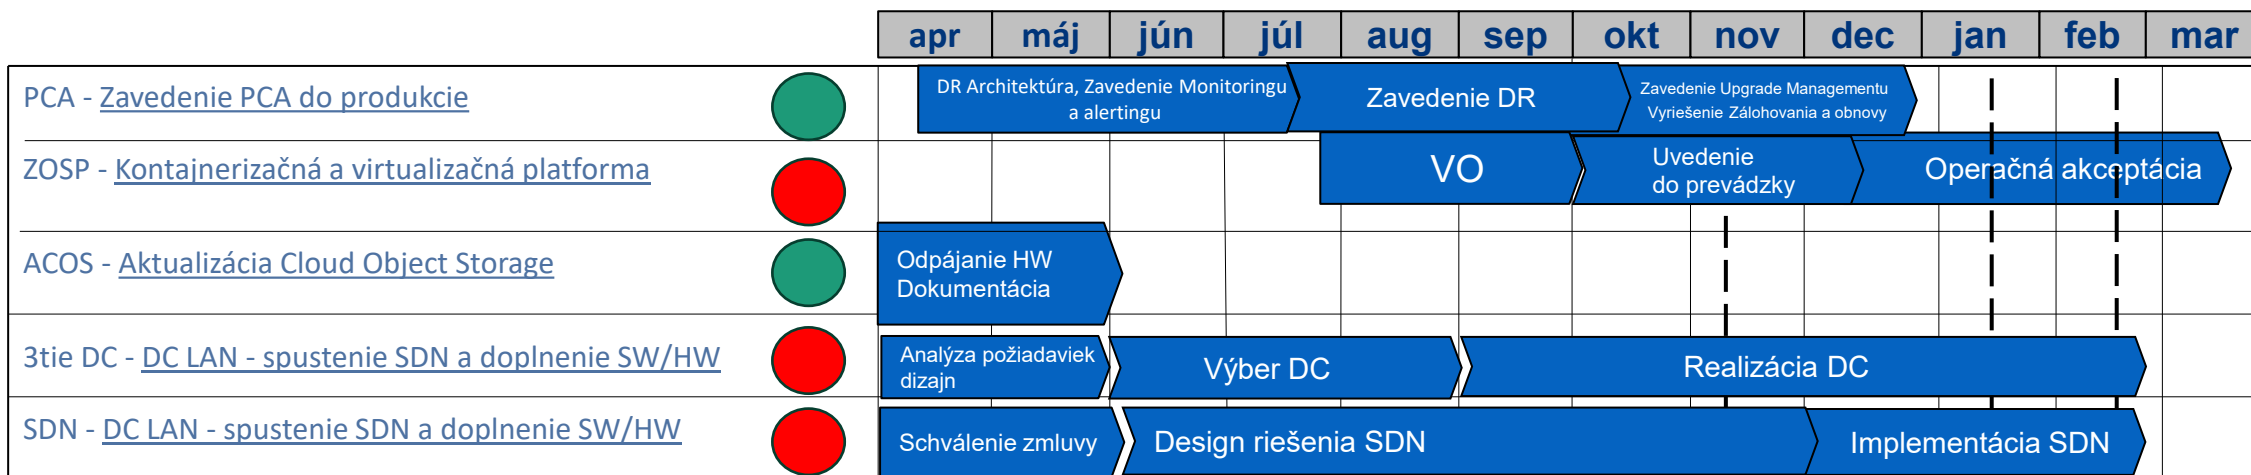

ID	Projekt	Popis rizika	Závažnosť	Stav	Rieši	Spôsob predchádzania rizika alebo manažovania dopadov
1	PCA – Zavedenie do produkcie	Pre moduly prístupné z internetu bežíme na managersku výnimku, PCA nema HA (negarantovane RPO a RTO)	Vysoká	Nastalo	Pavol Kantorek	Zapojenie teamu Oracle v riešení

Customer journey

Platforma pre životné situácie - sprístupnenie

Zákaznícka cesta občana prezentuje zlepšenia, ktoré prinesie sprístupnenie Platformy pre životné situácie. Súčasťou prinášaných riešení je ich jednotný dizajn podľa ID SK, ako aj mobilná verzia. Riešenia budú integrované do centrálného portálu verejnej správy a sú predpokladom zavádzania digitálnych riešení pre životné situácie a prepracovania koncepcie obchodných procesov zapojených inštitúcií štátnym na skvalitnenie služieb pre koncových používateľov.

Jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb a jasná navigácia

Zrozumiteľné, aktuálne a personalizované návody na jednom mieste

Jednotné miesto pre realizáciu služieb

KÓPIA

Číslo záznamu: 074606/2025

Centrálny nástroj na tvorbu formulárov, ktorý občanovi prináša jednotný prívetivý dizajn. Formuláre je možné podpísať mobilom a ich používanie je monitorované s cieľom zlepšiť elektronické služby

Výmena dát medzi inštitúciami s cieľom minimalizovania potrebných vstupov občana

Plynulé prechody cez životnú situáciu

Prehľad o stave spracovania podania

Integrácie medzi informačnými systémami verejnej správy, aby občan získal informáciu o stave svojho podania

Notifikácia o stave

Výmena dát medzi inštitúciami a proaktívne informovania občana o stave jeho podania či iných skutočnostiach



Customer journey Platforma pre životné situácie - sprístupnenie

Zákaznícka cesta občana prezentuje zlepšenia, ktoré prinesie sprístupnenie Platformy pre životné situácie. Súčasťou prinášaných riešení je ich jednotný dizajn podľa ID SK, ako aj mobilná verzia. Riešenia budú integrované do centrálného portálu verejnej správy a sú predpokladom zavádzania digitálnych riešení pre životné situácie a prepracovania koncepcie obchodných procesov zapojených inštitúcií štátnym na skvalitnenie služieb pre koncových používateľov.



Jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb a jasná navigácia

- 1 Nové návody na Slovensko.sk**
Všetky návody na jednom mieste
- 2 Interaktívny sprievodca**
Personalizované návody s rozhodovacím stromom

Jednotné miesto pre realizáciu služieb

KÓPIA
Číslo záznamu: 074606/2025

Vytváranie formulára

- 1 eForm dizajnér**
Nástroj na tvorbu elektronických formulárov pre inštitúcie
- 2 Dátové integrácie (CPDI)**
Redukcia polí vo formulároch, znižovanie počtu vstupov používateľa pri realizácii podania
- 3 Podpisovanie cez mobilnú aplikáciu**
Upgrade súčasného podpisovača slovensko.sk, zjednodušená autorizácia
- 4 Konsolidovaná analytická vrstva**
Participácia používateľov na skvalitňovaní služieb štátu vďaka nástroju na zber spätnej väzby a monitoringu životnej situácie

Plynulé prechody cez životnú situáciu


- 1 Dátové integrácie (CPDI)**
Výmena údajov medzi inštitúciami, znižovanie počtu vstupov používateľa pri realizácii podania

Prehľad o stave spracovania podania

- 1 Centrálna API manažment platforma**
API manažment platforma pre integrácie medzi informačnými systémami verejnej správy na strane OVM voči centrálnym komponentom, lepší manažment API rozhraní OVM

Notifikácia o stave

- 1 Centrálny notifikačný modul**
Posielanie notifikácií v kontexte životných situácií (proaktívna komunikácia, stavy konania)
- 2 Centrálna API manažment platforma**
API manažment platforma pre integrácie medzi informačnými systémami verejnej správy na strane OVM voči centrálnym komponentom, lepší manažment API rozhraní OVM





PLÁN [OBNOVY]

cestovná
mapa k lepšiemu
Slovensku

Splnomocnenie

Dolu podpísaný **Ing. Radoslav Štefánek, štátny tajomník II, predseda** Riadiaceho výboru programu „Slovensko 3.0: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií, (ďalej len „splnomocniteľ“) v súlade s článkom 5 bodom 5 a bodom 6 Štatútu Riadiaceho výboru programu „**Slovensko 3.0: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií**“


splnomocňuje

Ing. Otta Szökeho, generálneho riaditeľa Sekcie informačných technológií verejnej správy (ďalej len „splnomocnenec“)

na zastupovanie splnomocniteľa v čase jeho neprítomnosti na zasadnutí Riadiaceho výboru programu „**Slovensko 3.0: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií**“, ktoré sa uskutoční dňa **22.09.2025**.

Splnomocnenec je na základe tohto splnomocnenia oprávnený zastupovať splnomocniteľa pri účasti ako aj hlasovaní na vyššie uvedenom Riadiacom výbore v zmysle článku 5 bodu 5 a bodu 6 Štatútu Riadiaceho výboru projektu.

V Bratislave, dňa: **22.09.2025**


.....
Ing. Radoslav Štefánek
(splnomocniteľ)

Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam.

V Bratislave, dňa: **22.09.2025**


.....
Ing. Otta Szöke
(splnomocnenec)

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 074606/2025

KÓPIA

Vec: Zápis zo zasadnutia Riadiaceho výboru programu Slovensko 3.0: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválenie – podpísanie spracovateľom	07.10.2025 16:01	Hernández, Alba María, Ing.	referent 2	oPKPMO	referent	Nie		
Schválenie – podpísanie spracovateľom	08.10.2025 11:11	Hernández, Alba María, Ing.	referent 2	oPKPMO	referent	Nie		
Schválené	08.10.2025 14:12	Omolková, Martina, Mgr.	vedúci	oPKPMO	vedúca oddelenia	Nie		Schvaľujem 1
Schválené	08.10.2025 14:27	Toman, Jozef, Mgr.	vedúci	OPRIZ	riaditeľ odboru	Nie		Schvaľujem 1
Schválené	09.10.2025 14:50	Szőke (SİRES), Otto, Ing.	vedúci	SİRES	poverený vykonávaním funkcie VZ (GRS)	Áno	Szőke, Otto, Ing.	Schvaľujem 1
Schválené	10.10.2025 08:23	Štefánek, Radoslav, Ing.	vedúci	ST2	štátny tajomník II	Nie		Schvaľujem 1
Ukončiť spracovanie - odoslanie	10.10.2025 08:23	Štefánek, Radoslav, Ing.	vedúci	ST2	štátny tajomník II	Nie		
